

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	문화예술과	
					직 위	전화번호
문화 관광 체육 (4-2)	2027년	도비, 시비	10%	정상	과 장	5022
					팀 장	5171
					담당자	5172

◆ 목 표

- 백제가요 「정읍사», 「상춘곡», 「태인방각본」 등 문학적 유산과 자원을 가진 문학도시로서의 정읍 위상 제고
- 시민의 문학 교육·창작·향유 시설로 조성하여 지역의 문학진흥 기반 마련

◆ 개 요

- 기 간 : 2026 ~ 2027년
- 위 치 : 정읍시 정읍사로 498-9(현 정읍농악전수회관)
- 사 업 비 : 3,000백만원(도 1,200, 시 1,800) / 지방자치단체 전환사업
 - 2026년 : 1,500백만원(도 600, 시 900) * 추경 편성예정
- 규 모 : 농악전수회관 연면적 1,263㎡, 지상 3층
- 내 용 : 농악전수회관 기능 이전 후 문학관으로 리모델링
 - 전시실, 수장고, 다목적실, 사무실, 창작실, 북카페 등

◆ 재원조달계획


(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	3,000 (3,000)						1,500	1,500
도비	1,200 (1,200)						600	600
시비	1,800 (1,800)						900	900

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 부지 검토 및 지역문학인 의견수렴 '22. 9 ~ 11월



【2023. 1 ~ 12월】

- 민간추진위원회 간담회(추진방향 설명 및 의견수렴) '23. 2월
- 선진문학회 견학(안동 이육사문학회, 광주문학회) '23. 5월, 11월
- 공립문학회 등록자료 조사 '23. 8 ~ 11월

【2024. 1 ~ 12월】

- 문학회 건립 추진보고(완료시기 변경 / 임기내→임기후) '24. 8월
- 민간추진위원회 간담회(추진상황 공유 및 의견수렴) '24. 10월

【2025. 1 ~ 12월】

- 문학회 건립 사전협의 완료(문화체육관광부) '25. 2월
- 도비 예산 건의(도 문화산업과, 예산과) '25. 3월, 8 ~ 9월
- 선진문학회 견학(안동 이육사문학회) '25. 5월
- 도비 가내시 통보(1,500백만원 - 도비 600, 시비 900) '25. 11월
- 민간추진위원회 간담회(추진상황 공유 및 의견수렴) '25. 12월

◆ 금후계획

- 예산 편성(1,500백만원 - 도비 600, 시비 900) '26. 제1회추경
- 건축기획 및 설계용역 '26. 9월 ~ '27. 3월
- 리모델링 공사 및 개관 준비 '27. 4 ~ 9월
- 개관 '27. 하반기

◆ 문제점 및 대책

- 26년도 도비(600백만원) 확보하였으나, 시의회 심의결과 전액 삭감

☑ 제1회 추경예산 추진 시 확보

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	동학유산과	
					직 위	전화번호
문화 관광·체육 (4-3)	2030년	국, 도, 시	100%	이행 후 계속추진	과 장	5054
					팀 장	6931
					담당자	6933

◆ 목 표

- 백제시대 축조되어 조선말까지 지방통치 행정중심지로 활용되었던 고사부리성을 복원하여 문화유산 가치 향상 및 역사성 정립
- 지역 문화유산과 연계 다양한 역사문화 체험 및 교육기회 제공 등 지역 발전의 토대 마련

◆ 개 요

- 기 간 : 2010 ~ 2030년
- 대 상 : 고부면 고부리 산1-1번지 일원
- 사 업 비 : 25,800백만원(국 17,275, 도 3,703, 시 4,822)
 - 2025년 : 100백만원(국 70, 도 15, 시 15) / 성벽복원 설계
- 사업내용 : 성벽 복원(650m), 진입로 및 주차장 정비
 - ┌ '25년 : 성벽 복원설계(70m), 진입로(484m) 및 주차장(36면) 정비
 - └ '26년 : 성벽 복원(70m, 21억), 발굴조사(100m, 10억)
 - └ '27~'30년 : 연차별 성벽 발굴조사 → 복원설계 → 복원공사 시행

【정읍 고사부리성】 사적, 2008. 5. 28 지정, 지정면적 92,127㎡, 둘레길이 1,050m

▶ 정비계획 : 성벽 1,050m 중 650m 복원(서문~남문~북문)

※ 서문~북문사이 400m 구간 원형보존

▶ 추진현황 : '23년까지 313.1m 완료(공적률 약 48.1%), 잔여구간 336.9m

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	25,800 (19,300)	7,200	1,020	1,800	1,350	100	1,000	13,330
국비	17,625 (12,235)	5,040	714	750	1,020	70	700	9,331
도비	3,627.5 (2,623)	1,080	153	150	80	15	150	1,999.5
시비	4,547.5 (3,742)	1,080	153	900	250	15	150	1,999.5

◆ 추진실적

【총괄】

- 발굴조사(11회, 37억원) '00 ~ '24년
- 성벽(416.1m), 민락정지, 객사지, 건물지(13동), 집수정지 등 발굴
- 성벽 복원공사(313.1m, 57.6억원, 공정률 48.1%) '11 ~ '23년

구분	총 사업량	추진 사업량 (민선8기 : 65m 복원)											잔여 사업량
		계	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017~2021	2022	2023	2024	
사업량 (m)	650	313.1	57.2	57.9	25.5	25.3	37.0	45.2	-	33.9	31.1	-	336.9
사업비 (억원)	163.1	57.6	5.3	9.7	4.0	4.3	7.3	9.0	-	8.0	10.0	-	105.5

- 성 진입로 및 주차장 조성(8.2억원, 공정률 100%) '23 ~ '25년
- 진입로 484m, 주차장 36면 조성

【2023. 1 ~ 12월】

<고사부리성 복원>

- 성내 부지 매입(6필지, 36,610㎡, 2.8억원) '23. 08월
- 남동측성벽 복원공사 완료(31.1m, 10억원) '23. 11월

<고사부리성 진입로 및 주차장 정비>

- 부지 매입(12필지, 3,680㎡, 4.7억원) '23. 07월
- 설계 착수 '23. 10월

【2024. 1 ~ 12월】

<고사부리성 복원>

- 동측성벽 발굴조사 완료(73m, 1,080㎡, 5.3억원) '24. 09월

<고사부리성 진입로 및 주차장 정비>

- 설계 완료 '24. 04월
- 공사 착수 '24. 08월

【2025. 1 ~ 11월】

<고사부리성 복원>

- 동측성벽 복원설계 완료(45m, 1억원) '25. 07월
- 동측성벽 복원설계 국가유산청 설계승인(45m, 20억원) '25. 09월
- 2026 동측성벽 복원공사비 국가예산 확보(22.5m, 10억원) ... '25. 09월

<고사부리성 진입로 및 주차장 정비>

- 공사 완료 '25. 06월

◆ 금후계획

- 동측성벽 복원공사 도 원가심사 '26. 01월
- 동측성벽 복원공사 착수 (20.4m, 10억원) '26. 03월
- 2026 동측성벽 복원공사비 국가예산 신청(24.6m, 10억원) ... '26. 04월
- 동측성벽 복원공사 완료 '26. 11월

◆ 문제점 및 대책

- 국비 지원 한계(발굴조사-설계-공사비 분리지원), 물가 상승 등으로 사업 지연 및 장기화
 - ▶ 민락정 복원 및 관람편의시설 확충 등 고사부리성 활용성 중심으로 종합정비계획을 재정비하고 중단기 활성화, 장기 성벽 복원 방향으로 사업 목표를 조정 추진

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	동학유산과	
					직 위	전화번호
문화관광체육 (4-4)	2026년	국비, 도비, 시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5054
					팀 장	6911
					담당자	6914

◆ 목 표

- 정읍 관내에 분포한 마한·백제문화권 유적의 지표조사와 단계별 시굴·발굴조사를 실시하여 종합적이고 체계적인 마한·백제문화권 복원 및 정비 추진
 - 정읍 늘제, 은선리와 도계리 고분군, 고부권 관방유적 등 마한·백제 문화권 유적에 대한 지표조사, 발굴조사, 학술대회, 종합정비계획 수립

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 대 상 : 정읍 마한·백제문화권 유적
- 사 업 비 : 1,845백만원(국 1,099, 도 307, 시 439)
 - 2026년 : 300백만원 (국 210, 도 45, 시 45)

◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	1,845	-	250	345	300	330	300	320
국비	1,099	-	35	210	210	210	210	224
도비	307	-	47.5	67.5	45	54	45	48
시비	439	-	167.5	67.5	45	66	45	48

◆ 추진실적

【2022년】

- 은선리와 도계리 고분군 시굴조사(9,233㎡) '22. 4~9월
- 삼국시대 고분 3기, 수혈유구 3기, 시대미상 토광묘 3기 확인
- 고부권 역사문화 발굴 및 복원을 위한 학술용역 '22. 4~10월
- 놀제 시굴조사 착수(1,600㎡) '22. 11월

【2023년】

- 두승산성 지표조사(백제시대 추정 성벽 및 유물 등 확인) '23. 4~8월
- 놀제 발굴조사(250㎡) '23. 4~10월
- 놀제의 제방으로 추정되는 성토층 확인(김제 벽골제, 익산 황등제와 유사한 성토)
- 은선리와 도계리 고분군 정밀발굴조사(1차, 600㎡) '23. 5~12월
- 삼국시대 고분 1기(관정 등 출토), 고려시대 이후 건물지 1동 확인(기와 등 출토)

【2024년】

- 은선리와 도계리 고분군 시굴(17,013㎡)·발굴조사(2차, 350㎡) '24. 3~11월
- 삼국시대 고분 4기 확인, 금은청동제 장신구, 토기 등 다량의 유물 출토

【2025년】

- 은선리와 도계리 고분군 정밀발굴조사(3차, 1,121㎡) '25. 3~11월
- 삼국시대 고분 9기 확인, 금제 장신구 및 토기 등 다량의 유물 출토
- 고분군 출토 유물 국립전주박물관 특별전 전시 '25. 6~10월
- 정읍 놀제 역사규명과 정비를 위한 학술대회 개최 '25. 9. 26.

◆ 금후계획

- 은선리와 도계리 고분군 발굴조사(4차) '26. 3~11월
- 은선리와 도계리 고분군 일대 주차장 부지 확보 '27년
- 은선리와 도계리 고분군 종합정비계획 수립 용역 '27년
- 고분 호수 재지정(사적 지정 고분 개수 증감), 유구정비 방법, 관람동선 설정 등

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	관광과	
					직 위	전화번호
문화·관광·체육 (4-5)	2025년	국비, 도비, 시비, 기금	100%	이행후 계속추진	과 장	5031
					팀 장	5201
					담당자	5204

◆ 목 표

- 내장산국립공원, 내장산리조트권역, 내장산 문화광장을 연계한 관광벨트화로, 관광 및 지역경제 활성화 도모

◆ 개 요

- 기 간 : 2023 ~ 2025년(3년)
- 총사업비 : 457,523백만원(국 58,900, 도 31,906, 시 85,970, 기 280,747) ※ 민자제외
 - 2025년 사업비 : 35,096백만원(국 575, 도 3,380, 시 5,081, 기 26,060)
- 주요내용

① 내장산 개발

사업명	기간	예산(억원)	사업내용	비고
내장호 주변(해제지역) 종합발전계획 용역	'22	0.7	- 연구용역 1식	
대표관광지 육성사업	'20~'25	77	- 조선왕조실록 이안 조형물 등	
월영습지 및 솔티숲 생태관광지 조성	'22~'27	22	- 생태관광지 조성 등	
내장호 치유관광지 기반조성사업	'26~'28	100	- 치유센터 조성, 아트힐링정원 조성	
해동호텔 건립	'23~'27	3,000	- 해동그룹 호텔(66,609m ²) 등	민자

2 용산호 개발

사업명	기간	예산(억원)	사업내용	비고
내장산리조트 개발	'05~'25	3,251	- 대일내장산CC, 호텔건립 추진	
내장산리조트 연결도로 조성	'18~'24	229	- 도로확포장, 교량, 터널	
한국가요촌 달하 명품관광지 조성사업	'25~'28	58	- 한옥숙박체험시설, 복합문화공연시설 등	
용산호 복합힐링레저 공간조성	'20~'23	127	- 산책길, 용분수, 모래사장 등	
한국가요촌 달하 활성화 사업	'20~'26	53	- 음악놀이터 등	
내장산 자연휴양림 조성	'20~'26	175	- 숲속의 집, 산림휴양관 등	
한국전기안전공사 교육원	'16~'23	567	- 교육원(36,266㎡) 등	민자

3 문화광장 개발

사업명	기간	예산(억원)	사업내용	비고
문화광장 순환열차 조성	'22~'24	55	- 순환열차 유원시설 등	
목재문화체험장 조성	'21~'23	52	- 목공체험실, 체험프로그램 등	
정읍문화유산 방문자센터	'20~'25	195	- 상설 전시·체험시설 구축 - 실감콘텐츠 전시 등	
익스트림 스포츠시설 및 동화마을 테마공간 조성	'23~'26	50	- 익스트림 스포츠 시설 - 동화마을 테마공간	
메인주차장 조성	'22~'27	30	- 주차장	
배후주차장 조성	'23~'26	37	- 주차장, 화장실 등	
드림랜드 상가존 조성	'23~'26	23	- 지상2층 상가존 등	
기적의 놀이터 조성	'22~'25	40	- 어린이 특화놀이터 조성	
국민연금공단 연수원	'21~'27	413	- 연수원(46,316㎡) 등	민자

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
계	457,523 (295,782)	161,741	58,465	87,687	94,530	35,096	7,718	12,286
국비	58,900 (34,234)	24,666	16,582	6,629	10,403	575	45	
도비	31,906 (26,806)	5,100	3,940	4,101	7,600	3,380	1,842	5,943
시비	85,970 (54,539)	31,431	15,703	9,637	11,944	5,081	5,831	6,343
기타	280,747 (180,203)	100,544	22,240	67,320	64,583	26,060	-	-

◆ 추진실적 및 계획

권역별	사 업 내 용	예산(억원)	사업기간	비고
내장산 개발	· 내장호 주변 종합발전계획 수립	0.7	'22	완료
	· 대표관광지 육성사업 - 조선왕조실록 이안 조형물 - 야간경관(가로등) 조성 사업 - 단풍터널, 포토존 조성 및 홍보마케팅	77	'22~'25	완료
	· 월영습지 및 솔티숲 생태관광지 육성 - 완 방문자센터 운영 - 완 방문자센터 다목적실 증축 - 완 탐방로(정읍시) 준공, 진흥프로그램 매년 추진 - 진 보존길(국립공원)(27년 준공예정)	22	'22~'27	진행
	· 내장호 치유관광지 기반조성사업 - 계 실시설계용역 추진 - 계 치유센터, 아트힐링정원 등 조성 추진	100	'26~'28	진행
	· 해동호텔 조성[민자] - 완 지구단위계획 수립 착수 및 현장답사 - 완 측량 등 부지현행화 - 진 지구단위계획수립 및 건축설계 등 행정절차 이행 - 호텔건립[민자]	3,000	'23~'27	진행
	용산호 개발	· 내장산리조트 개발 - 완 JB통합연수원 준공 및 개원 - 완 내장산골프장 골프텔 건축허가 완료 - 완 클럽하우스, 모래적재창고 증축완료 - 완 내장산리조트 연결도로 확장 완료 - 진 골프텔 건축설계사무소 변경, 설계변경 후 준공	3,251	'22~'26
· 내장산리조트 연결도로 조성 - 완 내장산리조트 연결도로 확장 완료		229	'18~'24	완료
· 용산호 복합힐링 레저공간 조성 - 분수전망대, 뿌리데크, 감성포토존, 야간경관 - 낭만모래사장, 물빛무대, 물억새, 산책길 등		127	'20~'23	완료
· 한국가요촌 달하 활성화 사업 - 완 정촌가요특구 명칭 공모 및 변경(한국가요촌 달하) - 완 야외음악놀이터 및 편의시설 설치 - 진 전시관 내부 콘텐츠 보강 - 진 야간경관 개선		53	'22~'26	진행
· 명품관광지 조성사업 - 완 기본계획 수립 - 진 실시설계용역 추진 - 계 한옥숙박시설, 복합문화공연시설 등 조성 추진		58	'25~'28	진행

권역별	사 업 내 용	예산(억원)	사업기간	비고
용산호 개발	<ul style="list-style-type: none"> · 내장산 자연휴양림 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 완 숲속의 집, 산림휴양관 - 완 방문자 안내소, 다목적 구장 등 - 완 행정절차 이행 및 건축공사 발주 - 진 정상 운영 및 개장(26.3) 및 잔여분 준공(26.6) 	175	'20~'26	진행
	<ul style="list-style-type: none"> · 한국전기안전공사 전기안전교육원 및 실증단지[민자] <ul style="list-style-type: none"> - 교육원, 연구원 실증단지, 서부지사 준공 	567	'23	완료
문화 광장 개발	<ul style="list-style-type: none"> · 문화광장 순환열차 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 열차 1량, 객차 3량, 철로 2.3km, 철도역 4개소 	55	'22~'24	완료
	<ul style="list-style-type: none"> · 목재문화체험장 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 건축 기본 및 실시설계용역 - 공사추진 및 준공 	52	'21~'23	완료
	<ul style="list-style-type: none"> · 정읍문화유산 방문자센터 (상설 전시·체험시설 구축, 실감콘텐츠 전시 등) <ul style="list-style-type: none"> - 완 건축물 기본 및 실시설계용역 - 진 공사 및 콘텐츠 사업 추진 - 계 시험 및 본격 운영(26.3) 	195	'20~'25	진행
	<ul style="list-style-type: none"> · 익스트림 스포츠시설 및 동화마을 테마공원 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 완 기본구상 및 타당성 조사용역 - 완 행정절차 이행 및 실시설계용역 - 진 공사추진 및 준공(26.3) 	50	'23~'26	진행
	<ul style="list-style-type: none"> · 메인주차장 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 진 보상협의 - 진 실시설계용역 - 계 미보상 토지수용절차 - 계 공사추진 및 준공 	30	'22~'27	진행
	<ul style="list-style-type: none"> · 배후주차장 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 완 보상협의 - 진 사업추진 및 준공(26.4) 	37	'23~'26	진행
	<ul style="list-style-type: none"> · 드림랜드 상가존 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 완 공유재산심의 등 행정절차 이행 - 진 건축심의 완료 및 실시설계용역 추진 - 계 공사추진 및 준공 	23	'23~'26	진행
	<ul style="list-style-type: none"> · 기적의 놀이터 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 완 기본 및 실시설계용역, 공사착공 - 완 준공 및 운영 	40	'22~'25	완료
	<ul style="list-style-type: none"> · 국민연금공단 연수원 조성[민자] <ul style="list-style-type: none"> - 완 NPS 분양토지 잔금 납부 - 진 공사추진 및 준공 	413	'21~'27	진행

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	관광과	
					직 위	전화번호
문화·관광·체육 (4-6)	2026년	시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5031
					팀 장	5231
					담당자	5234

◆ 목 표

- 정읍의 역사·문화·자연환경 등 다양한 지역 자원을 연계한 관광 콘텐츠 개발, 홍보, 운영을 통한 관광 생활 인구 확대

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 위 치 : 정읍시 전체
- 사 업 비 : 1,200백만원(시비)
 - 2025년 : 145백만원(시비)
- 주요내용 : 관광개발사업 발굴 및 테마별 코스개발을 통한 관광객 유치

◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	1,200 (1,150)	50		145	145	145	145	570
국비								
균특								
도비								
시비	1,200 (1,150)	50		145	145	145	145	570
기타								

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 제2회 추경편성에 따른 용역사업 심의(적정) '22. 8월
- 제2회 추경 확보(50백만원) '22. 9월
- 기본계획 수립 연구용역 추진계획 보고 '22. 11월
- 일상감사 의로 및 회신 '22. 11월
- 용역계약 및 착수 '22. 12월

【2023. 1 ~ 12월】

- 용역 최종보고 및 용역완료 '23. 6월
- 관광안내판 등 관광시설물 정비(23개소) '23. 1 ~ 12월
- 꿈나무 시티투어 운영(8개교 / 237명) '23. 4 ~ 12월
- 단체관광객 유치 여행사 인센티브 지급(5개 여행사 / 579명) '23. 7 ~ 12월
- 테마형 시티투어(정기투어, 특별투어) 실시(4회 / 54명) '23. 7 ~ 12월
- 국내외 관광객 유치를 위한 팸투어 시행(3회 / 142명) '23. 7 ~ 12월
- 모바일 스탬프 투어(78명) '23. 7 ~ 12월

【2024. 1 ~ 12월】

- 정읍형 관광상품 개발을 위한 전문가 팸투어(3회) '24. 1 ~ 10월
- 관광안내판 등 관광시설물 정비(18개소) '24. 1 ~ 12월
- 단체관광객 유치 여행사 인센티브 지급(35건 / 1,101명) '24. 1 ~ 12월
- 테마형 시티투어(정기투어, 특별투어) 실시(39회 / 583명) '24. 3 ~ 12월
- 꿈나무 시티투어 운영(11개교 / 885명) '24. 4 ~ 10월
- 모바일 스탬프 투어(282명) '24. 6 ~ 12월
- 관광명소 사진 리뉴얼 '24. 10 ~ 11월
- 관광홍보달력 제작 '24. 11월

【2025. 1 ~ 12월】

- 관광홍보 책자 제작 '25. 1 ~ 6월
- 관광안내판 등 관광시설물 정비(24개소) '25. 9 ~ 10월
- 자연·역사·문화 콘텐츠 관광상품 개발 및 운영 '25. 3 ~ 11월
 - 한국철도공사와 연계한 관광상품(에코레일, 철도 반값 여행)
 - 트레일런과 웰니스가 결합된 관광상품(트레일런, 요가, 싱잉볼 등 체험프로그램)
 - 젊은 세대 감각을 반영한 후루룩(면) 투어
 - '나는 솔로' 방송 프로그램 제작 지원
 - 관광상품 기획 및 운영(트래블 스냅투어, 내장산 365, 내장산 8봉 챌린지)
- 정읍 관광 홍보 '25. 3 ~ 12월
 - KTX 용산역 내 기둥 전광판 활용 영상 홍보
 - 수도권 건물 외벽 전광판 활용 영상 홍보
 - 차량 롤배너 활용 홍보
 - KTX 객차안 모니터 활용 영상 홍보
 - 고속도로 휴게소 내 모니터 활용 영상 홍보
- 관광홍보영상 제작(4개 국어 / 8편) '25. 5 ~ 11월
- 국·내외 관광객 유치를 위한 팸투어 시행(2회) '25. 10 ~ 11월
- 단체관광객 유치 여행사 인센티브 지급(20건 / 672명) '25. 3 ~ 12월
- 시티투어 실시(31회 / 577명) '25. 3 ~ 12월
- 꿈나무 시티투어 실시(9개교 / 659명) '25. 3 ~ 12월
- 모바일 스탬프 투어 시행(270명) '25. 6 ~ 12월

◆ 금후계획

- 방송 프로그램 제작 지원 '26. 1 ~ 9월
 - MBC 「셰프의 DNA」, SBS 「김부장」, KBS 「생로병사의 비밀」
- 웰니스페스타(내장산 트레일런) 개최 '26. 9월
- 관광홍보영상 제작 '26. 2 ~ 11월
- 정읍 관광 홍보 '26. 2 ~ 12월
- 시티투어 실시 '26. 3 ~ 11월
- 국·내외 관광객 유치를 위한 팸투어 시행 '26. 3 ~ 11월
- 관광상품 기획 및 운영 '26. 3 ~ 12월
- 모바일 스탬프 투어 시행 '26. 3 ~ 12월
- 단체관광객 유치 여행사 인센티브 지급 '26. 3 ~ 12월

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	관광과	
					직 위	전화번호
문화·관광·체육 (4-7)	2025년	국비, 도비, 시비	75%	정상	과 장	5031
					팀 장	5201
					담당자	5203

◆ 목 표

- 국가지정문화재(명승)로 지정(2021. 12. 9.)된 「삼남대로 갈재」 옛길을 보존하고 고유한 스토리 자원을 발굴·개발하여 관광자원 개발 및 관광 활성화 추진

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년) ※ 국가유산구간 국비 추가 확보에 따른 기간 연장
- 위 치 : 입암면사무소 ~ 삼남대로 갈재
- 규 모 : L=4.3km(명승구간 L=0.8km, 구간외 L=3.5km)
- 총사업비 : 1,226백만원(국 332, 도 71, 시 823) ※ 국가유산구간 국도비 추가 확보
- 주요내용 : 종합정비계획 수립, 탐방로 정비(안내판, 이정표, 쉼터 등), 편의시설 조성(주차장, 진입로 정비, 상징조형물 설치) 등

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	1,226 (1,226)			110		850	266	
국비	332 (332)			42		105	185	
도비	71 (71)			9		22	40	
시비	823 (823)			59		723	41	

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 입암 갈재 옛길 활용 관광자원화 추진계획 수립 '22. 9월

【2023. 1 ~ 12월】

- 문화재청 사업확정 통보 '23. 2월
- 삼남대로 갈재 종합정비계획 수립 '23. 7월 ~ '24. 10월
 - 최종보고회('24. 3월), 국가유산청 승인('24. 8월), 용역완료('24. 10월)

【2024. 1 ~ 12월】

- 국가유산 구간 실시설계 착수 '24. 11월

【2025. 1 ~ 12월】

- 국가유산 외구간 실시설계 착수 '25. 3월
- 주차장 부지 협의(한국도로공사) '25. 4 ~ 10월
- 국가유산 구간(갈재 옛길 경관 및 시설 보수) 실시설계 완료 '25. 6월
- 국가유산 구간 정비사업 설계 승인(국가유산청) '25. 9월
- 국가유산 외 구간(갈재 관광자원화) 실시설계 완료 '25. 9월
- 국가유산 구간 입지적정성 용역 착수 '25. 10월
- 국가유산구간 공원계획변경 용역 착수 '25. 11월
- 국가유산 구간(갈재 옛길 정비) 1-3구간 공사 착수 '25. 12월
 - 착수('25.12.26.)

◆ 금후계획

- 국가유산구간 입지적정성 평가 및 공원계획변경 추진 '25. 11월 ~ '26. 5월
- 삼남대로 갈재 정비 사업 추진 '25. 12 ~ '26. 12월
 - (국가유산 구간) 갈재 옛길 정비 1~3구간 재착공('26.2월) 및 사업완료('26. 5월)
 - (국가유산 구간) 갈재 옛길 정비 4~7구간 사업완료('26. 12월)
 - (국가유산 외 구간) 갈재 관광 자원화 사업 완료('26. 6월)

◆ 문제점 및 대책

- 주차장 조성 예정 부지 매각 추진 중 대통령 지시사항(진행,검토 중인 자산매각에 대해 전면 재검토/25.11)으로 매각 중단
 - ☑ 한국도로공사 전남본부와 사용허가 우선 협의후 향후 매각추진


분야 (분류번호)	완료 목표연도	예산	진도율	추진상황	관광과	
					직 위	전화번호
문화·관광·체육 (4-8)	2026년	국비, 도비, 시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5031
					팀 장	5201
					담당자	5204

◆ 목 표

- 정읍천 및 정읍역과 연계한 특색있는 볼거리 및 즐길거리 제공을 위한 관광핫플레이스 조성을 통해 도심 관광객 유입 및 활성화

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년) ※ 제7차 전북권 관광개발계획 반영에 따른 기간 연장
- 위 치 : 정읍천 ~ 정읍역 일원
- 총사업비 : 19,810백만원(국 1,500 도 3,000, 시 14,020, 기 1,290)
 - 2025년 사업비 : 2,650백만원(도비 800 시비 1,850)
- 주요내용
 - 핫플레이스 물테마시설(미로분수, 벽천분수 등), 야간경관, 물빛축제
 - 정읍천 시민정원, 문화역사의거리 조성, 사진찍고싶은거리 조성 등

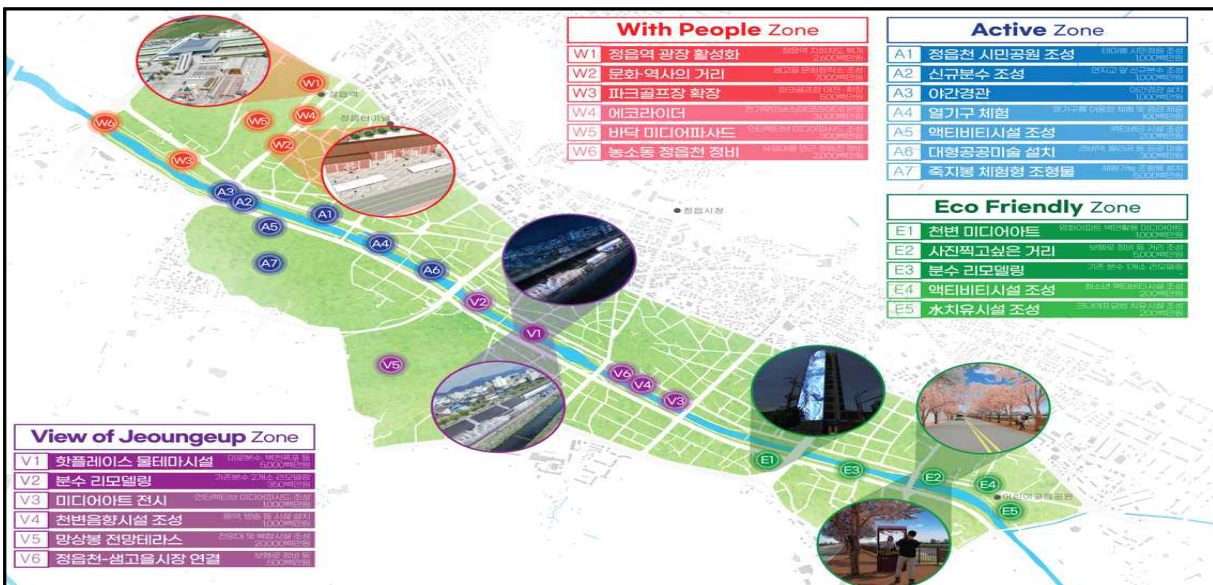

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	19,810 (19,810)		100	2,740	500	2,650	2,450	11,370
국비	1,500 (1,500)							1,500
도비	3,000 (3,000)				100	800	1,050	1,050
시비	14,020 (14,020)		100	2,650	400	1,850	1,400	7,620
기금	1,290 (1,290)			90				1,200

○ 투자계획(단기)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업내용	사업기간	총사업비	국비	도비	시비	기금	민자	비고
합계				19,810	1,500	3,000	14,020	1,290		
1	핫플레이스 기본계획	·기본계획 수립용역	'22~'23	100			100			
2	분수 리모델링 및 신규분수	·노후화 분수 3개소 리모델링 및 신규분수 조성을 통한 정음천 활성화	'23	190			100	90		
3	정음천 물빛축제	·물과 빛을 활용한 정음천 축제진행, 물테마시설 등과 연계	'23~'26	1,300			1,300			
4	핫플레이스 물테마시설	·미로·터널분수, 벽천분수 등 물테마시설을 통한 놀이·휴게공간 조성	'23~'26	5,000		500	4,300	200		
5	야간경관	·야간경관 확장을 통한 야간관광 활성화 및 관광객 체류시간 증대	'24~'26	1,070		540	530			
6	문화·역사의 거리	·유휴부지를 활용 복합문화공간 조성, 정음역~연지교 보행로 조성 및 정비	'24~'27	5,500		1,000	4,500			
7	사진찍고 싶은 거리	·천변 경관 및 보행로 정비를 통한 벚꽃로 정비	'26	5,000	1,500	960	1,540	1,000		
8	정음역 광장 활성화	·정음역 주변 정비를 통한 광장 활성화	'23~'24	150			150			
9	파크골프장 확장 이전	·노년층의 파크골프 수요 증가에 따라 확대 이전(9홀 이상, 편의시설 등)	'23~'28	500			500			
10	정음천 시민정원	·시민정원 조성을 통한 정음천 사계절 관광 활성화	'26	1,000			1,000			



핫플레이스 물테마시설 조성(안)



사진찍고 싶은 거리 조성(안)



문화역사의 거리 조성(안)

◆ 추진실적 및 계획

사업명	사업내용	예산 (백만원)	사업기간	비고
관광 핫플레이스 조성 사업 관광과	· 관광 핫플레이스 기본계획 수립완료	100	'22~'23	완료
	· 분수 리모델링 및 신규분수 - 인구소멸대응기금 확보(도비 90백만원) - 정읍천 분수 3개소 리모델링 및 야간경관(80백만원) - 정읍천 분수 추가 연출 용역(물빛축제)(20백만원)	190	'23	완료
	· 핫플레이스 물테마시설 - 완 미로분수 조성(2,100백만원) - 완 벽천분수 실시설계용역('24.4~/40백만원) - 완 행정절차이행(하천점용허가 6차례 협의,'24.10~'25.9) - 진 벽천분수 조성 추진('25.10~'26.6/1,300백만원) - 계 발담금터 조성 추진('26년/1,560백만원)	5,000	'23~'26	진행
	· 정읍천 야간경관 조성 - 완 기본계획 수립용역('24.2~11/30백만원) - 진 정읍천 야간경관 실시설계용역('24.12~'25.12/40백만원) - 계 정읍천 야간경관 조성 추진('26.1~6/1,000백만원)	1,070	'24~'26	진행
	· 문화역사의 거리 - 진 토지협의(국가철도공단 및 사유지) - 진 기본 및 실시설계용역('25.9~'26.6/90백만원) - 진 토지보상(철도부지, 사유지)('25~'26/2,230백만원) - 계 문화역사의 거리 조성사업 추진('26~'27/3,180백만원)	5,500	'25~'27	진행
	· 사진찍고 싶은 거리 - 계 기본 및 실시설계용역('26) - 계 사진찍고싶은 거리 조성사업 추진('27/5,000백만원)	5,000	'26~'27	진행
	· 정읍천 물빛축제 - 완 물빛 축제 추진 완료('23~'25/900백만원) - 진 미로분수 운영('25~'26/100백만원) - 계 물빛 축제 ('26/300백만원)	1,300	'23~'26	진행
정읍역 광장 활성화 도시과	· 정읍역 광장 활성화 - 기본 및 실시설계용역 - 정읍역 지하차도 복개공사 사업계획 변경(복개→광장정비) - 정읍역 광장 정비 완료	150	'23~'24	완료
파크 골프장 확장 이전 체육진흥과	· 파크골프장 확장 이전 - 하천저용 사전협의 · 하모동 80-2번지(하모교 일원) 홍수취약지구로 불가 - 정읍천 파크골프장 36홀 사업계획 변경 및 협의 반영 · 덕천면 달천리(정읍천대교 일원) 하천기본계획 반영 - 진 기본계획 및 타당성 조사용역('25.9~'26.12) - 계 실시설계용역 추진('26) - 계 공사 시행 및 준공('27~'28)	500	'23~'28	진행
정읍천 시민정원 산림복지과	· 정읍천 시민정원 - 정읍천 하천점용 사전협의 · 하천기본계획 수립 후('25년 이후) 협의 - 계 정읍천 시민정원 조성('26)	1,000	'26	진행

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	산림복지과	
					직 위	전화번호
문화관광체육 (4-9-1)	2026년	도비, 시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5035
					팀 장	5696
					담당자	5697

◆ 목 표

- 구절초 지방정원의 대외홍보 및 브랜드 강화, 지역경제 활성화 도모
- 관광객을 위한 다양한 자연 체험 및 축제 참여를 통한 힐링공간 조성

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년
- 위 치 : 구절초 지방정원(산내면 청정로 926-65 일원)
- 사 업 비 : 7,982백만원(도 480, 시 7,502)
 - 2025년 : 1,050백만원(도 50, 시 1,000)
- 주최/주관 : 정읍시/정읍지구절초축제추진위원회
- 주요내용 : 6개분야 40여 프로그램(개막,공연,체험,판매,전시,연출, 홍보 등)

◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	7,982 (5,470)	2,712	775	795	750	1,050	850	1,050
도비	480 (320)	160	50	70	50	50	50	50
시비	7,502 (5,150)	2,552	725	725	700	1,000	800	1,000

◆ 추진실적

【2022. 7월 ~ 12월】

- 제15회 정읍 구절초 꽃축제 개최 '22. 9. 29. ~ 10. 16.
 - 추진성과 : 방문객(266,274명), 경제효과(7,435백만원)
 - 판매장 운영(4개 부문 66개소) : 식당 16, 농특산물판매장 38, 구절초상품판매장 7, 푸드트럭 5
- 시군 대표축제 평가(전라북도) '22. 12. 26.
 - 평가결과 : 최우수축제 선정(도비 70백만원 지원)

【2023. 1 ~ 12월】

- 제16회 정읍 구절초 꽃축제 개최 '23. 10. 5.. ~ 10. 15.
 - 추진성과 : 방문객(280,445명), 경제효과(7,550백만원)
 - 판매장 운영(4개 부문 64개소) : 식당 13, 농특산물판매장 36, 구절초상품판매장 8, 푸드트럭 7
- 시군 대표축제 평가(전라북도) '23. 12. 20.
 - 평가결과 : 우수축제 선정(도비 50백만원 지원)

【2024. 1 ~ 12월】

- 제17회 정읍 구절초 꽃축제 개최 '24. 10. 3 ~ 10. 13
 - 추진성과 : 방문객(181,793명), 경제효과(6,611백만원)
 - 판매장 운영(5개부문 59개소) : 식당 13, 특산물먹거리판매장 38, 푸드트럭 7, 가든마켓 1
- 시군 대표축제 평가(전라북도) '23. 12. 20.
 - 평가결과 : 우수축제 선정(도비 50백만원 지원)

【2025. 1 ~ 12월】

- 제18회 정읍 구절초 꽃축제 개최 '25. 10. 14.. ~ 10. 26.
 - 추진성과 : 방문객(290,169명), 경제효과(7,177백만원)
 - 판매장 운영(4개 부문 64개소) : 식당 9, 특산물먹거리판매장 40, 푸드트럭 6)

◆ 금후계획

- 제19회 정읍 구절초 꽃축제 개최 '26. 10. 8. ~ 10. 18.

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	문화예술과	
					직 위	전화번호
문화 관광 체육 (4-9-2)	2026년	시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5022
					팀 장	5171
					담당자	5173

◆ 목 표

- 현존하는 유일한 백제가요 ‘정읍사’ 를 주제로 한 문화제를 개최하여 정읍사의 전통과 역사적·예술적 가치를 전국에 널리 알림

◆ 개 요

- 기 간 : 2022년~ (매년)
- 위 치 : 정읍사공원 일원
- 사 업 비 : 400백만원(시비)
- 주요내용 : 채수의례 및 여인제례, 개막식, 축하공연, 정읍사가요제 등
- 주최·주관 : 정읍시 · (사)정읍사문화제제전위원회

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
시비	2,586		526	400	430	430	400	400

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 2023 정읍사문화제 추진방향 협의 '22. 12월
 - 행사 일정 확정(10.28~10.29/시민의 날 기념행사 병합추진)
 - 정읍사문화제 기간 KBS 전국노래자랑 추진
- KBS 전국노래자랑 유치 신청 '22. 12월

【2023. 1 ~ 12월】

- KBS 전국노래자랑 예산확보(1회 추정) '23. 5월
- 정읍사문화제 기본계획 수립 '23. 6월
- 정읍사문화제 행사 대행업체 선정 '23. 7월
- KBS 전국 노래자랑 유치 확정 '23. 7월
- 정읍사문화제 행사 협상 추진 '23. 7월
- 정읍사문화제 세부추진계획 수립 '23. 9월
- 정읍사문화제 홍보 및 준비 '23. 9 ~ 10월
- 정읍사문화제 및 전국노래자랑 안전관리 심의 '23. 10월
- 정읍사문화제 개최(제29회 시민의 날 기념식 병행) '23. 10. 28. ~ 29.
※ 정읍사문화제 연계 KBS 전국노래자랑 예심(10. 27.) 및 녹화 추진(10. 29.)

【2024. 1 ~ 12월】

- 정읍사문화제 기본계획 수립 '24. 5월
- 정읍사문화제 행사 대행업체 선정 '24. 7월
- 정읍사문화제 부스 및 부도여인상 선발 공고 '24. 8월
- 정읍사문화제 홍보 시설 검토 의뢰(경찰서,건설과,도시과 등) '24. 8월
- 정읍사문화제 행사 관련 시설 협조 의뢰(공원,주차장,화장실 등) '24. 9월
- 정읍사문화제 안전관리계획 수립 '24. 9월
- 관련부서 협의 '24. 10월
- 시민의 날(총무과), 출향인 환영행사(시민소통실)
- 정읍사문화제 세부추진계획 수립 '24. 10월
- 정읍사문화제 행사 홍보 추진 '24. 10월
- 정읍사문화제 개최(제30회 시민의 날 기념식 병행) '24. 10. 26. ~ 10. 27.

【2025. 1 ~ 12월】

- 정읍사문화제 기본계획 수립 '25. 6월
- 정읍사문화제 행사 대행업체 선정 '25. 7 ~ 8월
- 정읍사문화제 부스 및 부도여인상 선발 공고 '25. 8월
- 정읍사문화제 홍보 시설 검토 의뢰(경찰서,건설과,도시과 등) '25. 8월
- 정읍사문화제 행사 관련 시설 협조 의뢰(공원,주차장,화장실 등) '25. 9월
- 정읍사문화제 안전관리계획 수립 '25. 9월
- 정읍사문화제 세부추진계획 수립 '25. 10월
- 정읍사문화제 행사 홍보 추진 '25. 10월
- 정읍사문화제 개최 '25. 10. 25. ~ 10. 26.

◆ 금후계획

- 정읍사문화제 기본계획 수립 '26. 5월
- 정읍사문화제 행사 준비 '26. 6 ~ 10월
- 제37회 정읍사문화제 개최 '26. 10. 24. ~ 25.

분야 (분류번호)	완료 목표연도	예산	진도율	추진상황	동학유산과	
					직 위	전화번호
문화·관광·체육 (4-9-3)	2026년	시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5054
					팀 장	6921
					담당자	6923

◆ 목 표

- 동학농민혁명의 발상지와 성지로서의 자긍심 고취와 정신 계승·발전
- 정읍의 새로운 동학농민혁명 정체성을 수립하고, 혁명도시의 위상 제고

◆ 개 요

- 기 간 : 2023 ~ 2026년(4년) * 2025. 5. 10.(토) ~ 5. 11.(일)
- 위 치 : 정읍시 일원(천변 및 정읍제일고 등)
- 총사업비 : 1,220백만원(시비)
 - 2025년 사업비 : 280백만원(시비)
- 추진방법 : 시민 참여 유도를 위해 거리 퍼레이드 진행, 제4회 세계 혁명도시 연대회의 및 제58회 동학농민혁명기념제를 동학농민혁명 기념일(5.11.)에 연계 추진
- 내 용 : 1894 진군행렬, 공식제례, 제58회 기념식 및 축하공연, 동학농민혁명大賞 및 공모전 시상식, 체험 및 플리마켓, 기획행사 등

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	1,220			280	280	280	380	
시비	1,220			280	280	280	380	

◆ 추진실적

- 제56회 동학농민혁명기념제 개최 ‘23. 5. 11.
- 제57회 동학농민혁명기념제 개최 ‘24. 5. 11 ~ 5. 12.

【2025. 1. ~ 12.】

- 보조금 교부 결정 및 지급 ‘25. 2. 21.
- 기념제 조직위원회 개최(1차) ‘25. 3. 5.
- 기념제 기본계획 보고(시장님) ‘25. 3. 7.
- 지원 협조 요청(교통통제, 질서유지, 의료지원 등) ‘25. 4월
- 기념제 조직위원회 개최(2차) ‘25. 4. 16.
- 안전관리계획 심의회 개최(조건부 가결) ‘25. 4. 28.
- 기념제 홍보를 위한 언론광고 실시(도내 일간지 등 21개소) ‘25. 4. 28.
- 기념제 세부추진계획 수립 ‘25. 5. 2.
- 행사장 설치(무대, 음향, 조명 등) ‘25. 5. 8.
- 행사장 안전 점검(소방, 전기, 가스 등) ‘25. 5. 9.
- 제58회 동학농민혁명기념제 개최 ‘25. 5. 10. ~ 5. 11.

◆ 금후계획

- 기념제 조직위원회 구성(제59회 동학농민혁명기념제) ‘26. 2월
- 기념제 세부추진계획 수립 ‘26. 4월
- 제59회 동학농민혁명기념제 개최 ‘26. 5. 10. ~ 5. 11.

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	동학유산과	
					직 위	전화번호
문화·관광·체육 (4-10-1)	2025년	시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5054
					팀 장	6921
					담당자	6923

◆ 목 표

- 동학농민혁명은 3·1운동의 뿌리이자 근대 국민 국가를 지향한 민중적 민족적 운동으로 대한민국의 진정한 출발
- 대한민국헌법 전문에 동학농민혁명 명칭과 정신을 명시하여 동학농민혁명정신 계승 발전 및 역사왜곡 방지

◆ 개 요

- 기 간 : 2023 ~ 2025년(3년)
- 총사업비 : 79백만원(시비)
 - 2025년 사업비 : 39백만원(시비)
- 내 용 : 여론 환기를 위한 전국 동학농민혁명 기념사업 단체 주관 토론회, 공동성명 발표 및 고등학교 검·인정 교과서 명칭 수정 등
 - ┆ 2023년 : 공동성명 발표(1차)
 - ┆ 2024년 : 전국민 공청회 개최(1회)
 - ┆ 2025년 : 토론회 개최(1회), 공동성명 발표(2차)

[동학농민혁명 명칭 및 정신 헌법 전문 명시를 위한 토론회·공동성명 발표]

- 일시/장소 : 2025. 10. 31.(금) 14:00~16:00 / 국회 의원회관 제3세미나실
- 참석인원 : 119명(시장님, 국회의원, 연구자, 전국 동학농민혁명 유족 및 단체 등)
- 내 용
 - 토 론 회 : 헌법 개정의 당위성 확보를 위한 발제(3명) 및 종합토론(5명)
 - 공동성명 : 시장님, 이재관·전종덕 국회의원, 21개 전국 동학농민혁명 유족 및 단체 공동 선언문 낭독 등

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	79			13	27	39		
시비	79			13	27	39		

◆ 추진실적

- 동학농민혁명 명칭 및 정신 헌법 전문 명시 공동 성명 발표(1차) ... '23. 10. 26.
- “동학농민혁명” 용어 국립국어원 표준국어대사전 등재 '24. 4월
- [기존] 동학농민 ‘운동’ → [추가] 동학농민 ‘혁명’
- 헌법 전문 명시를 위한 토론회 및 공동성명 발표(2차) '25. 10. 31.

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	동학유산과	
					직 위	전화번호
문화·관광·체육 (4-10-2)	2026년	시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5054
					팀 장	6921
					담당자	6923

◆ 목 표

- 동학농민혁명 발상지로서의 위상 제고 및 자긍심 고취
- 동학농민혁명의 근대적 가치 재조명을 바탕으로 정읍 동학농민혁명의 정체성 구축
- 동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법 개정 및 한국사 검인정 교과서 수정을 위한 기반 구축(동학농민혁명의 시작 고부 농민봉기) * 매년 학술대회 주제 변경

◆ 개 요

- 기 간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 위 치 : 정읍시 관내
- 참석인원 : 100여명(시장님, 윤준병의원, 도·시의원, 전국 동학 단체·유족, 시민 등)
- 총사업비 : 105백만원(시비)
 - 2025년 사업비 : 30백만원(시비)
- 내 용 : 기초강연, 주제발표(5명) 및 종합토론 등

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	105			25	25	30	25	
시비	105			25	25	30	25	

◆ 추진실적

- 학술대회 개최(동학농민혁명교육관) ‘23. 11. 3.
- 『만석보 위치 고증과 활용방안 모색을 위한 학술대회』
- 학술대회 개최(동학농민혁명교육관) ‘24. 7. 11.
- 『유족 증언을 통해 본 동학농민군의 삶 학술대회』
- 학술대회 개최(동학농민혁명교육관) ‘25. 6. 25.
- 『동학농민혁명 참여자의 지역별 활동과 성격 학술대회』

◆ 금후계획

- 학술대회 발표자 및 토론자 선정 ‘26. 2월
- 발표자 및 토론자 원고 작성 ‘26. 2~5월
- 학술대회 홍보물 및 자료집 제작 ‘26. 6월
- 학술대회 개최 ‘26. 6월(예정)

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	동학유산과	
					직 위	전화번호
문화·관광·체육 (4-10-3)	2025년	국비, 도비, 시비, 기타	100%	이행 후 계속추진	과 장	5054
					팀 장	6921
					담당자	6923

◆ 목 표

- 동학농민혁명 주요 유적지 기틀 마련과 정비를 통하여 동학농민혁명의 도시 정읍의 위상을 재정립하고 전 국민에게 동학의 자주·평등·민주주의 정신을 널리 알리고자 함
- 동학농민혁명 유적지에 대한 역사성과 독창성을 확립하고 각 유적지를 연계하여 지역의 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 기반 시설 정비

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2032년(11년)
- 총사업비 : 43,875백만원
 - 2025년 : 57백만원

① 고부관아 복원 사업 기반조성

- 기 간 : 2023 ~ 2032년(10년)
 - 사 업 비 : 37,050백만원(고부관아복원 사업비 도 15,000, 시 22,050)
 - 내 용
 - 국가지정 문화유산(사적) 지정 추진
 - 고부초·중 통합운영학교 설립
 - 고부관아 복원(동헌, 내아, 객사, 향청, 작청 등) * 완전·부분·상징복원
 - 문화사업(고부봉기 재현행사 등) 연계를 위한 주변지역 정비 등
- ※ 정읍시-도교육청 고부초·중 통합운영학교 설립 및 고부관아 복원 업무협약(MOU) : '25. 6월

② 4대장군 유적지 정비

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 사 업 비 : 675백만원(시비)
 - 2025년 : 57백만원
- 위 치 : 과교동 289번지 외 30필지(A=11,359㎡)
- 내 용 : 4대장군 유적지 정비(안내판 및 담장정비, 제초작업등)
- ※ 무기고 부지 매입, 안내판, 담장 정비 완료 : '25. 11월

③ 말목장터 문화광장 조성사업 기틀 마련

- 기 간 : 2022 ~ 2027년(6년)
- 사 업 비 : 6,150백만원(국 2,510, 도 750, 시 2,890) ※ 기투자 포함
- 내 용 : 광장, 감나무부스, 상징조형물, 쉼터 등 조성
- ※ 말목장터 광장 잔여부지(도담지역아동센터) 매입 협의 완료 및 예산반영 : '25. 10월

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년		2027년 이후
계	2,476 (26,741)	1,384	9	180	95	57	341	410	
국비	270 (2,500)	10						260	
도비	0								
시비	1,865 (24,241)	1,374	9	180	95	57		150	

◆ 추진실적

【2023. 1. ~ 2024. 12월】

- 고부관아 복원을 위한 기본구상 용역 '22. 2월
- 고부초 주변 토지 및 건축물 탁상감정(2,104,563,720원) '23. 1월
- 고부관아 복원을 위한 전문가 토론(4월), 학술대회(9월), 공청회(11월) '23년
- 4대장군 유적지 지속적인 보상 협의 및 유적지 매입 추진 '23년
- 말목장터 문화광장 타당성조사 용역 및 국가예산 확보 노력 '23년
- 고부관아 복원을 위한 간담회(8회) '23. 11월 ~ '24. 8월

- 고부초 이전 고부초·중 통합학교 건립 주민설명회 및 동의서 장구(고부면) .. ‘24. 9. 13.
- 고부관아 복원 이전 부지 ‘고부중’ 적정 회신(정읍교육지원청) ‘24. 9. 30.
- 고부초중 통합학교 건립 제반경비에 대한 분담비율 협의 ‘24. 10. 24.
- 4대장군 유적지 정비(제초 및 안내판 정비 등) ‘24년
- 말목장터 조성사업 국가예산 확보를 위한 문체부 방문 및 지방재정투자심사 ... ‘24년

【2025. 1. ~ 현재】

- 말목장터 조성사업 국가예산 확보를 위한 도청 방문 ... ‘25. 2월
- 고부관아 복원을 위한 정읍교육지원청 업무 협의(3회) ‘25. 2월 ~ 4월
- 갑오동학혁명기념탑 전지작업 ‘25. 3월
- 손화중 장군 생가터 안내표지판 정비 ‘25. 3월
- 고부면 동학농민혁명 무기고 부지 및 주변 정비 ‘25. 4월
- 전봉준장군 마지막 거주지 매입 협의 ‘25. 4월
- 정읍교육지원청 학부모 설명회 등 행정절차 이행 촉구 ‘25. 4월
- 말목장터 부지 정형화를위한 도담지역아동센터 소유주 면담(3회) ... ‘25. 4~7월
- 말목장터 조성사업 국가예산 확보를 위한 문체부 방문 ‘25. 5월
- 4대장군 유적지 매입을 위한 소유인 유선 면담 ‘25. 6. ~ 10월
- 정읍시청-도교육청 업무협약(고부초·중 통합운영학교 설립 및 고부관아 복원) ‘25. 6. 18.
- 도담지역아동센터(말목장터) 매입 협의 완료 ‘25. 9월
- 통합운영학교 설립 및 고부관아 복원 추진협의체 구성(교육청-정읍시) ‘25. 9월
- 고부면 동학농민혁명 무기고 부지 안내판 설치 ‘25. 10월
- 여산송씨(송두호, 주옥, 국섭) 사발통문 작성 참여자 묘 안내판 설치 ‘25. 11월

◆ 금후계획

- 고부초·중 통합운영학교 설립 ‘26~30년
- 말목장터 광장조성사업 추진 ‘26~28년
- 고부 관아 사적지 지정 및 복원사업 추진 ‘27~33년
- 4대장군 유적지 정비 ‘27~30년

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	체육진흥과	
					직 위	전화번호
문화 관광 체육 (4-11)	2026년	도비, 시비	70%	정상	과 장	5048
					팀 장	5251
					담당자	5254

◆ 목 표

- 동학농민혁명 기념공원과 어울림센터 연계한 체육시설 확충 필요
- 역사와 스포츠 관광산업 육성을 위한 서북권 축구장 조성

◆ 개 요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
- 사업위치 : 덕천면 신월리 산72번지 (황토현권역어울림센터 일원)
- 사업규모 : 축구장 1면 조성 (A=27,595㎡)
- 사업내용 : 국제규격 축구장(105×68) 1면, 주차장 87면, 부대시설 1식 등
- 사 업 비 : 5,425백만원 [도비(전환) 894, 도비(추가) 596, 시비 3,935]
- 2026년 : 4,300백만원 [도비(전환) 894, 도비(추가) 596, 시비 2,810]

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	5,425	-	-	25	700	400	4,300	-
도비 매칭	도비 (전환)	894	-	-	-	-	894	-
	도비 (추가)	596	-	-	-	-	596	-
	시비	1,490	-	-	-	-	1,490	-
자체 재원	시비 (추가)	2,445	-	25	700	400	1,320	-

◆ 추진실적

- 행정절차 이행 ' 22. 11월 ~ ' 25. 8월
 - 중기지방재정 반영, 공유재산 관리계획, 지방재정 투자심사(자체)도시계획위원회 심의, 도시관리계획(체육시설) 결정 및 지형도면 고시, 소규모 환경영향평가, 소규모 재해영향평가
- 타당성 및 기본계획 용역 완료 ' 23. 12월
- 실시설계용역 및 실시계획인가 용역 착수 ' 24. 7월
- 토지 보상 추진 ' 25. 6월 ~
 - (전체) 16필지, 27,595㎡ / (국·공유지) 8필지, 1,864㎡, 6.7% / (사유지) 8필지, 25,731㎡, 93.3%
 - (보상률 88.8%) 보상완료 사유지 6필지, A=22,844㎡, 642백만원
 - (미협의를률 11.2%) 미협의 사유지 2필지(미등기 2), A=2,887㎡, 71백만원
- 실시계획인가 ' 25. 9월
- 전북도 원가심사, 시 일상감사 및 계약심사 ' 25. 10 ~ 11월
- 토지 수용재결 ' 25. 12월
- 토목·조경 공사 총괄분 발주 ' 25. 11. 28.
- 토목·조경 공사 1차분 착공(공정률 30%) ' 25. 12. 23.
 - 별개제근, 현장사무실 설치, 등 추진 ' 26. 1월
- 보상금 공탁(미등기 2필지, 71백만원) ' 26. 1. 21.

◆ 금후계획

- 토목·조경 공사 1차분 완료 ' 26. 2월
- 토목·조경 공사 2차분 추진(토공,구조물 등) .. ' 26. 2월 ~ ' 27. 2월
- 전기·통신 공사 추진 ' 26. 3 ~ 12월
- 전체 공사 준공 ' 27. 2월

※ '26. 12월한 신속 준공 적극 추진

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	체육진흥과	
					직 위	전화번호
문화 관광 체육 (4-11)	2029년	시비	10%	정상	과 장	5048
					팀 장	5251
					담당자	5255

◆ 목 표

- 전국 규모 대회 개최가 가능한 규모의 체육관 건립으로 각종 대회 유치하여 지역경제 활성화 기여
- 다목적 체육시설 공급으로 엘리트 선수 육성과 생활 체육인 체육시설 수요 충족 및 시민들의 생활 체육 참여 확대
- 체육 복지 증진을 통해 정읍의 브랜드 가치 제고

◆ 개 요

- 기 간 : 2023 ~ 2029년(7년)
- 위 치 : 정읍시 상평동 277-3번지 일원
- 사 업 비 : 37,000백만원
- 내 용 : 다목적체육관 건립(연면적 7,686㎡, 지하1층~지상2층)
* 배드민턴 16면, 핸드볼 1면, 배구 3면, 농구 3면 등

◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	37,000 (37,000)	0	0	100	0	0	0	36,900
시비	37,000 (37,000)	-	-	100	-	-	-	36,900

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 배드민턴 전용경기장 건립 계획(도매시장 / 10면) ' 22. 8월
- 민선8기 공약사업 이행보고회(핸드볼 겸용 검토) ' 22. 11월
- 복합체육관 건립사업 검토 보고 ' 22. 11월
- 규모: 배드민턴 16면 및 타종목 겸용 / - 위치: 스포츠타운 조성 부지

【2023. 1 ~ 12월】

- 사업계획 변경 결정 보고 ' 23. 2월
- 규모: 복합문화센터 병행 추진 → 단일사업 추진
- 위치: 스포츠타운 조성 부지 → 수성동 산40-2번지 일원
- 타당성 및 기본계획 수립 용역 착수 ' 23. 3월
- 공유재산관리계획 승인 보류(시의회) ' 23. 5월
- 의회: ①입지타당성 조사 미완료 ②500억 규모로 심도 깊은 논의 필요

【2024. 1 ~ 12월】

- 타당성 및 기본계획수립 보고회 개최 ' 24. 6월
- 입지분석 : 정읍체육공원 내 인라인스케이트장 도출
- 시정 현안 협업 회의(수성동 산40-2 대체사업 발굴) ... ' 24. 7월
- 사업계획 변경 결정 보고 ' 24. 8월
- 위치: 수성동 산40-2번지 → 정읍체육공원 내 인라인스케이트장
- 지방재정영향평가 / 중기지방재정계획 수립 ' 24. 11월
- 공유재산관리계획안 보류건 철회 ' 24. 11월
- 타당성 및 기본계획 수립 완료 ' 24. 12월

【2025. 1 ~ 10월】

- 지방재정 투자심사(중앙): 재검토 ' 25. 4월
- 사유 : ①규모의 적정성 재검토 ②운영수지 재분석 ③지방비 부담 최소화
④체육공원 전체의 중장기 운영전략 및 운영계획 구체화
- 민·관 협의체 구성 및 운영 ' 25. 5월
- 지방재정 투자심사 재상정(도): 재검토 ' 25. 10월
- 사유 : ① 인근 유사시설 안전등급 및 지방비 부담 등 종합적 고려
② 지방비 부담 최소화 방안 마련
- 공유재산관리계획 재상정 승인 보류(시의회) ' 25. 10월
- 사유: 다목적체육관 건립부지 재검토

◆ 금후계획

- 공유재산관리계획 및 지방재정투자심사 ’ 26. 2 ~ 12월
- 다목적 체육관 실시설계 ’ 27. 1 ~ 12월
- 공사 착공 ’ 28. 1월 ~ ’ 29. 12월

◆ 문제점 및 대책

- 수성지구 복합문화공간 조성과 다목적체육관 건립위치 이견 발생(정읍시의회)
 - ▶ 정읍시의회 설득 후 공유재산 관리계획 승인 추진
- 지방재정투자(도) 심사 결과(재검토)
 - ▶ 심사 결과 보완(대규모체육관 건립 필요성 부각 등)하여 재상정 추진

분야 (분류번호)	완료 목표연도	예산	진도율	추진상황	체육진흥과	
					직 위	전화번호
문화 관광 체육 (4-13)	2027년	시비	30%	정상	과 장	5048
					팀 장	5251
					담당자	5252

◆ 목 표

- 국가하천 부지를 활용하여 전국대회 개최 가능한 36홀 규모 골프장을 조성함으로써 스포츠 관광 산업화를 통한 지역경제 활성화 기여

◆ 개 요

- 사업기간 : 2025년 ~ 2027년(3년)
- 위 치 : 덕천면 달천리 19번지 일원 (정읍천대교 하류 좌안둔치)
- 총사업비 : 1,500백만원(시비 1,500) ※ 국비: 4,000백만원 (환경청 시행)
- 내 용
 - ┌ 환경청 : 파크골프장 36홀 및 부속시설(관리동, 화장실 등) 조성
 - └ 정읍시 : 주차장 조성

◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
시비	1,500 (1,500)	-	-	-	-	-	500	1,000

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 민선8기 공약사업 추진 ' 22. 10월
- 위치: 하모동 80-2번지 / 규모: 9홀

【2023. 1 ~ 12월】

- 하천 전용 사전협의 ' 23. 4월
- 환경청: 하모교 일원 홍수취약지구에 따른 하천점용 불가
- 파크골프장 사업계획 변경 및 협의 ' 23. 11월
- 정읍천대교 하류 좌안둔치 일원 36홀 파크골프장 조성을 위한 하천기본계획 반영 요청 건의
- (환경청) 하천기본계획 및 실시설계용역 추진 ' 23. 12월
- 덕천면 달천리 19번지 고수부지 정비 계획 반영

【2024. 1 ~ 12월】

- 파크골프장 부속시설 설치 관련부서 검토 요청 ' 24. 11월
- 주차장 등 부속시설 대상 부지 용도지역이 농림, 보전관리지역으로 농지 전용 등 제약사항에 대한 관련부서 협의 및 해소방안 모색

【2025. 1 ~ 10월】

- 도지사 정읍 방문에 따른 시장님 건의 ' 25. 2월
- 파크골프장 조성 인근 농림지역 해제 건의
- 대선공약 대응 TF(건설과) 공조 추진 ' 25. 7월
- 부속시설(주차장, 매표소, 클럽하우스 등) 설치 검토 .. ' 25. 9월
- 부속시설 설치예정지 관련 부서 협의(국토계획법, 농지법, 하천법 등)
- 부속시설 편입예정 토지 소유자 협의 추진(1차 대면·통화 협의 완료)
- 동진강 하천기본계획 수립에 따른 관계기관 의견 제출 ' 25. 10월
- 제출의견 : 파크골프장 대상지역 친수지구 반영
- 정읍천대교 기본구상 용역 발주 및 착수 ' 25. 10월
- 행정절차 이행 완료 ' 25. 11월
- 중기지방재정 반영, 공유재산 관리계획, 지방재정 투자심사(자체)
- 기본구상(안) 협의 추진(환경청) ' 25. 12월
- 기본구상(안) 작성 및 검토중(공정율 80%) ' 26. 1월

◆ 금후계획

- 파크골프장 기본구상(안) 확정 ’ 26. 2월
- 민선8기 공약사업 변경 요청 ’ 26. 4월
 - 변경내역
 - ① 완료 목표연도: 당초 2027년 → 변경 2028년
 - ② 총사업비: 당초 1,500백만원(시비) → 변경 12,000백만원(시비)
 - ③ 내 용
 - 당초: (환경청) 파크골프장 36홀 및 부속시설(관리동, 화장실 등) 조성
(정읍시) 주차장 조성
 - 변경: (환경청) 친수지구 지정 및 고수부지 정비
(정읍시) 파크골프장 36홀 및 부속시설 조성
- 부속시설 부지매입 및 도시계획결정 변경 ~ ’ 26. 11월
- 정읍천대교 파크골프장 실시설계 추진 .. ’ 26. 6월 ~ ’ 27. 5월
 - (환경청) 정읍천 하천환경정비 실시설계(안) 확정 후 추진
- 정읍천대교 파크골프장 준공 ’ 27. 6월 ~ ’ 28. 12월
 - (환경청) 정읍천 하천환경정비 공사 시 파크골프장 조성 병행 추진
