

| 분 야<br>(분류번호)     | 완 료<br>목표연도 | 예산 | 진도율  | 추진상황 | 회계과 |      |
|-------------------|-------------|----|------|------|-----|------|
|                   |             |    |      |      | 직 위 | 전화번호 |
| 도시·교통·환경<br>(6-1) | 2026년       | 시비 | 100% | 완료   | 과 장 | 5025 |
|                   |             |    |      |      | 팀 장 | 5321 |
|                   |             |    |      |      | 담당자 | 5322 |

## ◆ 목 표

- 정읍시 발전과 시민들의 삶의 질 향상을 위해 활용하고자 정읍 교육지원청 이전 부지를 매입하고자 함

## ◆ 개 요

- 사업기간 : 2023년
- 매입대상 : 구)정읍교육지원청 부지 및 건물
  - ┌ 토지 : 정읍시 상동 319-12번지 / 대지 / 4,161㎡(1,258평)
  - └ 건물 : 연면적 2,298.16㎡
- 사 업 비 : 4,945백만원(시비)
- 내 용 : 구)정읍교육지원청 부지 및 건물 매입
- 활용방안 : 리모델링 후 정읍시 평생학습관으로 활용

## ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 시비 | 4,945            |     |       | 4,945 |       |       |       |             |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사 ..... ’ 22. 9월
- 공유재산관리계획 승인(시의회) ..... ’ 22. 10월
- 부지 및 건물매입 협의(전북교육청) ..... ’ 22. 7 ~ 12월
- 부지 및 건물매입비 2023년 본예산 반영 ..... ’ 22. 10 ~ 12월

### 【2023. 1 ~ 12월】

- 매매계약 체결 및 소유권 이전 ..... ’ 23. 2월
- 재산 인계(회계과 ⇒ 인재양성과) ..... ’ 23. 3월
- 건물정밀안전진단 용역 시행(인재양성과) ..... ’ 23. 4 ~ 6월
- 리모델링 실시설계 용역 시행(인재양성과) ..... ’ 23. 9 ~ 12월

### 【2024. 1 ~ 12월】

- 리모델링 공사 시행(인재양성과) ..... ’ 24. 1 ~ 8월
- 정읍시 평생학습관 개관(인재양성과) ..... ’ 24. 9월

| 분야<br>(분류번호)          | 완료<br>목표연도 | 예산     | 진도율 | 추진상황 | 일자리경제과 |      |
|-----------------------|------------|--------|-----|------|--------|------|
|                       |            |        |     |      | 직 위    | 전화번호 |
| 도시·교통·<br>환경<br>(6-2) | 2028년      | 도비, 시비 | 70% | 정상   | 과 장    | 5056 |
|                       |            |        |     |      | 팀 장    | 5621 |
|                       |            |        |     |      | 담당자    | 5622 |

## ◆ 목 표

- 연지시장 내 노후 기반시설 정비와 다양한 문화공간 조성으로 시장활성화를 도모하여 “가고 싶은 문화시장” 및 “전국 제일 명품 시장” 으로 발돋움

## ◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2028년(7년)
- 대 상 : 연지시장 일원
- 사 업 비 : 5,000백만원(도 1,245, 시 3,755)
  - 2025년 : 100백만원(시 100)
- 주요내용
  - ① 기반시설 정비(시설현대화) : 2,625백만원(도 1,245, 시 1,380)
  - ② 연지시장 정비방안 마련 및 종합발전계획 수립·시행

## ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계  | 5,000<br>(2,925) | 2,075 | 550   | 0     | 0     | 100   | 0     | 2,275       |
| 도비 | 1,245<br>(0)     | 1,245 | -     | -     | -     | -     | -     | -           |
| 시비 | 3,755<br>(2,925) | 830   | 550   | -     | -     | 100   | -     | 2,275       |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 기반시설 정비(시설현대화) ..... '21 ~ '22년
  - 위 치 : 연지시장 중앙통로부(입구 ~ 소성그릇)
  - 사 업 비 : 2,625백만원(도비 1,245, 시비 1,380)
  - 사업내용 : 아케이드(막구조물) 개선, 간판 및 통로정비, 화장실 개선 등

### 【2023. 1 ~ 12월】

- 연지시장 번영회, 상인 등 발전 방향 논의 ..... '23. 1~12월

### 【2024. 1 ~ 12월】

- 연지시장 실태조사(연혁, 현장조사, 실태조사서 작성) ..... '24. 1~12월

### 【2025. 1 ~ 11월】

- 연지시장 번영회 등 주민 의견 수렴 ..... '25. 3월
- 용역 예산 확보(1회 추경 / 100,000천원) ..... '25. 6월
- 용역 발주 ..... '25. 7월
- 연지시장 정비계획 수립용역 시행 ..... '25. 11월 ~ '26. 8월

## ◆ 금후계획

- 연지시장 행정지도 등 미사용 장옥 활성화 방안 수행 ... '26년 ~
- 종합발전계획 및 시행계획 수립 ..... '27년
- 종합발전계획 시행 ..... '28년

## ◆ 문제점 및 대책

- 연지시장 실태조사 결과에 따른 공유재산(장옥) 관리 필요
  - ▣ 공유재산(장옥) 불법 사용에 대한 단계별 행정지도 실시와 시장 사용허가 허가조건(기간) 변경 등 행정절차 추진
- 연지시장 개발 계획 다각적 분석 및 경제성 검토 필요
  - ▣ 개발계획 수립 및 경제성 등 분석을 위한 연지시장 정비계획 및 타당성 조사 용역 추진

| 분 야<br>(분류번호)             | 완 료<br>목표연도 | 예산     | 진도율 | 추진상황 | 환경정책과 |      |
|---------------------------|-------------|--------|-----|------|-------|------|
|                           |             |        |     |      | 직 위   | 전화번호 |
| 도시·<br>교통·<br>환경<br>(6-3) | 2027년       | 국비, 시비 | 35% | 정상   | 과 장   | 5034 |
|                           |             |        |     |      | 팀 장   | 5731 |
|                           |             |        |     |      | 담 당 자 | 5732 |

## ◆ 목 표

- 가축분뇨의 안전하고 효율적 처리로 수질개선 및 쾌적한 생활환경 조성
- 우분을 연료로 생산·사용함으로써 토양·수질 등 환경오염 방지

## ◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2027년(6년)
- 위 치 : 영파동 404-9번지 일원(33,482㎡)
- 사 업 비 : 44,600백만원(국 34,600, 시 10,000) / 토지매입비(13억원) 시비 포함  
- 2025년 : 2,174백만원(전액 시비)
- 내 용 : 우분의 건조·탄화로 고체연료화하여 화력발전소 등 연료로 활용

## ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외)   | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|--------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계  | 44,615<br>(44,600) | 15  | 3,572 | 500   | 0     | 0     | 0     | 40,528      |
| 국비 | 34,600<br>(34,600) | -   | 250   | 500   | -     | -     | -     | 33,850      |
| 시비 | 10,015<br>(10,000) | 15  | 3,322 | -     | -     | -     | -     | 6,678       |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 지방재정 중앙투자 심사 통보 ..... '22. 3월

### 【2023. 1 ~ 12월】

- 전북도, 정읍시 외 3개시군, 축산과학원, 환경부(전북청) 회의 ..... '23. 2 ~ 4월
- 전북도 및 환경부(전북청) 보조사업자 변경 검토요청 ..... '23. 4월
- 전북도, 정읍시 외 3개 시군, 축산과학원, 환경부(전북청) ..... '23. 5월

#### 【수요처 확보(군산 OCI SE외 2개소)를 위한 MOU체결】

- 보조사업 인계 및 내용변경 요청 ..... '23. 5~7월
- 도 원가심사 및 시 일상감사 협의 ..... '23. 10월

### 【2024. 1 ~ 12월】

- 지방건설기술심의위원회 심의 ..... '24. 1월
- 기본 및 실시설계용역 조달청 발주 의뢰 ..... '24. 3월
- 기본 및 실시설계용역 계약 및 선금 지급 ..... '24. 6월

### 【2025. 1 ~ 10월】

- 재해영향성검토 용역 착수 ..... '25. 4월
- 공법선정 기술제안서 제출안내 공고 ..... '25. 4월
- 우분연료화 공법심의 추진 ..... '25. 4 ~ 10월

## ◆ 금후계획

- 우분연료화 공법심의 재추진 ..... '25.11 ~ '26. 1.
- 토지매입 협의 추진 ..... 연간
- 기본 및 실시설계 용역 준공 ..... '26. 3월
- 공사 발주 및 착공 ..... '26. 5월
- 공사 준공 및 시운전 ..... '27. 12월

| 분야<br>(분류번호)    | 완료<br>목표연도 | 예산            | 진도율  | 추진상황         | 자원순환과 |      |
|-----------------|------------|---------------|------|--------------|-------|------|
|                 |            |               |      |              | 직 위   | 전화번호 |
| 도사교통환경<br>(6-4) | 2025년      | 국비, 도비,<br>시비 | 100% | 이행 후<br>계속추진 | 과 장   | 5057 |
|                 |            |               |      |              | 팀 장   | 8161 |
|                 |            |               |      |              | 담당자   | 8163 |

## ◆ 목 표

- 노후경유차 감축 및 친환경차(전기, 수소 등) 보급 확대로 온실가스·미세먼지 감축

## ◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2025년(4년)
- 사 업 비 : 57,853백만원 (국비 31,849, 도비 8,166, 시비 17,838)
  - 2025년 : 9,564백만원 (국비 5,098, 도비 1,624, 시비 2,842)
- 주요내용 :
  - 노후경유차 조기폐차(4·5등급, 건설기계) : 876대 / 2,416백만원
  - 매년 저감장치 부착(5등급) : 10대 / 33백만원
  - 건설기계 엔진교체 : 40대 / 660백만원
  - 경유지게차 전동화 : 4대 / 152백만원
  - 1톤 화물차 전동화(신규) : 1대 / 15백만원
  - 친환경차 민간보급[전기(승용, 화물, 승합, 이륜), 수소] : 577대 / 6,288백만원

## ◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외)   | 기투자 | 2022년  | 2023년  | 2024년  | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|--------------------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|-------------|
| 계  | 57,853<br>(57,853) | -   | 10,374 | 14,875 | 10,968 | 9,564 | 6,049 | 6,023       |
| 국비 | 31,849<br>(31,849) | -   | 6,021  | 8,356  | 5,879  | 5,098 | 3,254 | 3,241       |
| 도비 | 8,166<br>(8,166)   | -   | 1,320  | 1,945  | 1,513  | 1,624 | 884   | 880         |
| 시비 | 17,838<br>(17,838) | -   | 3,033  | 4,574  | 3,576  | 2,842 | 1,911 | 1,902       |

## ◆ 추진실적

(단위 : 대, 백만원)

| 구 분                                          | 2022년        |               |              |              | 2023년        |               |              |               | 2024년        |               |              |              | 2025년        |              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                              | 예 산          |               | 집 행          |              | 예 산          |               | 집 행          |               | 예 산          |               | 집 행          |              | 예 산          |              | 집 행          |              |
|                                              | 사업량          | 사업비           | 사업량          | 사업비          | 사업량          | 사업비           | 사업량          | 사업비           | 사업량          | 사업비           | 사업량          | 사업비          | 사업량          | 사업비          | 사업량          | 사업비          |
| <b>합 계</b>                                   | <b>1,400</b> | <b>10,374</b> | <b>1,139</b> | <b>9,698</b> | <b>2,087</b> | <b>14,875</b> | <b>1,577</b> | <b>12,210</b> | <b>1,423</b> | <b>10,968</b> | <b>1,173</b> | <b>6,955</b> | <b>1,508</b> | <b>9,564</b> | <b>1,054</b> | <b>7,717</b> |
| 노후경유차<br>조기폐차<br>(45등급, 건설기계)                | 821          | 1,314         | 599          | 1,057        | 1,272        | 3,315         | 975          | 2,739         | 891          | 2,603         | 797          | 1,969        | 876          | 2,416        | 584          | 1,461        |
| 매연저감장치<br>부착 및<br>LPG화물차,<br>화물차 전동화         | 55           | 110           | 14           | 28           | 70           | 185           | 40           | 110           | 30           | 99            | 10           | 36           | 11           | 48           | 4            | 14           |
| 건설기계<br>저공해조치                                | 74           | 1,232         | 83           | 936          | 28           | 462           | 30           | 364           | 82           | 1,170         | 66           | 885          | 44           | 812          | 35           | 560          |
| 친환경차<br>민간보급<br>[전기(승용, 화물, 승<br>합, 이륜), 수소] | 450          | 7,718         | 443          | 7,677        | 717          | 10,913        | 532          | 8,997         | 420          | 7,096         | 300          | 4,065        | 577          | 6,288        | 431          | 5,682        |

## ◆ 금후계획

- ‘26년 미세먼지 저감사업 지속 추진 ..... ‘26. 2월 ~

## 내장저수지 주변 생태 공원화로 힐링도시 (월영습지 및 솔티숲 생태관광지 육성)

| 분 야<br>(분류번호)     | 완 료<br>목표연도 | 예산                | 진도율  | 추진상황        | 환경정책과 |      |
|-------------------|-------------|-------------------|------|-------------|-------|------|
|                   |             |                   |      |             | 직 위   | 전화번호 |
| 도시교통환경<br>(6-5-1) | 2025년       | 국비, 군특,<br>도비, 시비 | 100% | 이행후<br>계속추진 | 과 장   | 5034 |
|                   |             |                   |      |             | 팀 장   | 5701 |
|                   |             |                   |      |             | 담당자   | 5703 |

### ◆ 목 표

- 월영습지, 솔티숲 등 다양한 생태자원을 활용 최적의 생태관광지 조성
- 주변 여러 생태·문화 자원을 연계한 생태탐방 프로그램을 개발·운영하여 지역 농특산품 판매 등 지역 주민소득 창출

### ◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2027년(6년) / 국가생태관광지(2018 ~ 2026년)
- 위 치 : 송산동, 쌍암동 일원 10km<sup>2</sup> / 대표지점 솔티마을 주변
- 사 업 비 : 2,262백만원(국 241, 군특 890, 도 445, 시 686)
  - 2025년 : 1,132백만원(국 36, 군특 530, 도 265, 시 301)
- 사업내용 : 탐방로 신규 개설 및 관리, 방문자센터 운영, 생태관광 프로그램 운영 등

### ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계  | 8,747<br>(2,262) | 6,485 | 486   | 410   | 90    | 1,132 | 72    | 72          |
| 국비 | 406<br>(241)     | 165   | 43    | 45    | 45    | 36    | 36    | 36          |
| 군특 | 3,600<br>(890)   | 2,710 | 200   | 160   | -     | 530   | -     | -           |
| 도비 | 1,900<br>(445)   | 1,455 | 100   | 80    | -     | 265   | -     | -           |
| 시비 | 2,841<br>(686)   | 2,155 | 143   | 125   | 45    | 301   | 36    | 36          |

## ◆ 추진실적

- 솔티생태관광방문자센터 준공(개관 '23.6) ..... '22. 12월
- 국가생태탐방로(성지길) 조성공사 착공 ..... '24. 1월
- 솔티생태관광방문자센터 운영시스템 구축사업 시행 .... '24. 1월
- 솔티생태관광방문자센터 다목적실 정비공사 착공 ..... '24. 1월
- 솔티생태관광방문자센터 운영시스템 구축사업 완료 .... '24. 4월
- 솔티생태관광방문자센터 다목적실 정비공사 준공 ..... '24. 6월
- 국가생태탐방로(성지길) 산지전용허가 완료(정읍국유림관리소) .. '24. 10월
- 국가생태탐방로(성지길) 공원사업 시행허가 완료(내장산국립공원사무소) · '24. 11월
- 국가생태탐방로(성지길) 추가공사 설계 완료 ..... '24. 11월
- 국가생태탐방로(성지길) 추가공사 착공 ..... '24. 12월
- 국가생태탐방로(성지길) 준공 ..... '25. 8월
- 국가생태탐방로(보존길) 업무협약(정읍사·내장산국립공원사무소) .... '25. 10월
- 국가생태탐방로(보존길) 공원계획변경용역 착수 ..... '25. 10월

## ◆ 금후계획

- 국가생태탐방로(보존길) 공원계획변경용역 완료 ..... '26. 4월
- 국가생태탐방로(보존길) 위탁사업비 지급 ..... '26. 5월
- 국가생태탐방로(보존길) 산지일시사용신고 및 사유지 협의 ..... '26. 5월
- 국가생태탐방로(보존길) 준공 ..... '27. 12월

## 내장저수지 주변 생태공원화로 힐링도시 (1. 내장산 수목원 정비)

| 분 야<br>(분류번호)           | 완 료<br>목표연도 | 예산 | 진도율  | 추진상황 | 산림녹지과 |      |
|-------------------------|-------------|----|------|------|-------|------|
|                         |             |    |      |      | 직 위   | 전화번호 |
| 도시·교통<br>·환경<br>(6-5-2) | 2024년       | 시비 | 100% | 완료   | 부서장   | 5035 |
|                         |             |    |      |      | 팀 장   | 5691 |
|                         |             |    |      |      | 담당자   | 5693 |

### ◆ 개 요

- 기 간 : 2023. 2 ~ 11월 ※ 2023년 완료
- 위 치 : 쌍암동 405번지 일원
- 규 모 : 46,432㎡
- 주요내용 : 꽃무릇 확대 식재, 기존 산책로 정비, 노후 휴게시설 정비 등

#### < 내장산 수목원 현황 >

- 소 유 자 : 대상문화재단 (사립수목원) / (관리자 : 이성욱 010-4755-9383)
- 총 면 적 : 46,432㎡ (14,070평) ※ 조성년도 : 1993년
- 주요시설 : 잔디광장, 음수대, 산책로, 정자, 화장실 등
- ※ 등록 수목원 아님 (산림청, 전북)

- 사 업 비 : 200백만원(시 200)

### ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 시비 | 200(200)         | -   | -     | 200   | -     | -     | -     | -           |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 토지소유주(대상문화재단) 토지사용 협의(2회) …… '22. 8월 / 10월
  - 토지사용승낙(무상사용 등) / 일반인 개방 조건 / 입목벌채 및 식재 등
- 공원지역 사전 행정절차 협의 완료(2회) …………… '22. 8월 / 9월
  - 국립공원 내장산 사무소 협의
- '23년 사업 시행 본예산 요구(200백만원) …………… '22. 11월

### 【2023. 1 ~ 5월】

- 소유주(대상문화재단) 협의(1차) …………… '23. 1월
  - 정 읍 시 : 꽃무릇 식재 우선 추진
  - 대상문화재단 : 휴게시설 등 시설물 보수 여부 (상반기 확정)
- 꽃무릇 외 식재수종 검토 보고 …………… '23. 2. 17. ~ 3. 14.

※ 「2023년 주요업무 계획보고」 시장님 당부사항(1. 16.)

- 꽃무릇을 제외한 다른 품종 식재 검토 보고 완료 ▶ 백양꽃 식재

- 일상감사 요청 및 회신 …………… '23. 4. 12. ~ 4. 21.
- 소유주(대상문화재단) 유선 협의(2차) …………… '23. 4. 24.
  - 수목원 내 휴게시설 등 시설물 보수 → 정읍시 시행 제안
- 내장산수목원 정비 시행 …………… '23. 4. 26. ~ 6. 23.
  - 사업규모 : 4,450㎡ / 사업비 : 46백만원(도급액)
  - 사업내용 : 백양꽃(68,030본) 식재, 산책로 정비 471㎡ 등
- 내장산 수목원 배수로 등 정비공사 시행 …… '23. 7. 31. ~ 8. 30.
  - 사업내용 : 잔디수로(100m) 설치 등 / 사업비 : 6백만원(도급액)
- 내장산 수목원 백양꽃 보식 …………… '23. 11월
  - 사업내용 : 백양꽃 20,000주 식재 / 사업비 : 14백만원(도급액)

## 내장저수지 주변 생태 공원화로 힐링도시 (2. 내장산 자연휴양림 조기 완공)

| 분 야<br>(분류번호)           | 완 료<br>목표연도 | 예산            | 진도율  | 추진상황         | 산림복지과 |      |
|-------------------------|-------------|---------------|------|--------------|-------|------|
|                         |             |               |      |              | 직 위   | 전화번호 |
| 도시·교통<br>·환경<br>(6-5-2) | 2024년       | 균특, 도비,<br>시비 | 100% | 이행 후<br>계속추진 | 부서장   | 5035 |
|                         |             |               |      |              | 팀 장   | 5757 |
|                         |             |               |      |              | 담당자   | 5758 |

### ◆ 목 표

- 내장산 자연휴양림 조성으로 숲을 이용한 휴양공간 조성 및 산림복지서비스 제공

### ◆ 개 요

- 위 치 : 용산동 산50번지 일원
- 기 간 : 2020 ~ 2026년
- 규 모 : 시유지 487,878㎡(지정고시 면적)
- 사 업 비 : 17,500백만원(균특 4,750, 도 4,500, 시 8,250)  
- 2025년 : 4,000백만원(도 2,000, 시 2,000)

### ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외)   | 기투자   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계  | 17,500<br>(15,700) | 1,800 | 7,700 | -     | 4,000 | 4,000 | -     | -           |
| 균특 | 4,750<br>(3,850)   | 900   | 3,850 | -     | -     | -     | -     | -           |
| 도비 | 4,500<br>(4,500)   | -     | -     | -     | 2,500 | 2,000 | -     | -           |
| 시비 | 8,250<br>(7,350)   | 900   | 3,850 | -     | 1,500 | 2,000 | -     | -           |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 자연휴양림 조성계획 승인(전북도) ..... ‘22. 9월
- 상하수도, 부지조성 등 토목공사 착공 ..... ‘22. 11월
- 자연휴양림 지정 변경 고시(36→49ha/산림청) ..... ‘22. 11월

### 【2023. 1 ~ 12월】

- 전기, 통신, 소방공사 착공 ..... ‘23. 3월
- 조성계획 변경 승인(전북도) ..... ‘23. 11월
- 건축공사 계약(숲속의 집 9동, 산림휴양관) ..... ‘23. 12월

### 【2024. 1 ~ 12월】

- 건축공사 착공 ..... ‘24. 2월
- 1차 공사 완료(숲속의집 9동, 산림휴양관/토목,건축,전기,통신,소방) ..... ‘24. 12월
- 야영장 등 실시설계 용역 시행 ..... ‘24. 12월~‘25. 9월

### 【2025. 1 ~ 12월】

- 조성계획 변경 승인 신청(다목적구장→오토캠핑장/전북도) ..... ‘25. 8월
- 시범운영 추진 ..... ‘25. 10~11월  
※ 시설물 재정비 및 개장 전 보완사항 사전 조치, 이용객 만족도 조사 실시
- 조성계획 변경 승인(전북도) ..... ‘25. 12월

## ◆ 금후계획


- 숲속의집(2동), 오토캠핑장 등 공사 ..... ‘25. 12월 ~ ‘26. 7월
- 설문조사 결과 미비사항 보완조치 ..... ‘25. 12월 ~ ‘26. 2월
- 휴양림 운영(조성완료 시설물 대상) ..... ‘26. 3월
- 휴양림 조성 완료 ..... ‘26. 7월

| 분야<br>(분류번호)    | 완료<br>목표연도 | 예산           | 진도율  | 추진상황        | 도시과 |      |
|-----------------|------------|--------------|------|-------------|-----|------|
|                 |            |              |      |             | 직 위 | 전화번호 |
| 도시교통환경<br>(6-6) | 2026년      | 국비,도비,<br>시비 | 100% | 이행후<br>계속추진 | 과 장 | 5036 |
|                 |            |              |      |             | 팀 장 | 5801 |
|                 |            |              |      |             | 담당자 | 5802 |

## ◆ 목 표

- 낙후되고 쇠퇴한 구도심 상권의 활성화를 위해 시민과 관광객들이 방문하여 쉬면서 즐길 수 있도록 조성하여 구도심 상가 방문을 제고로 구도심권 경제 활성화에 기여

## ◆ 개 요

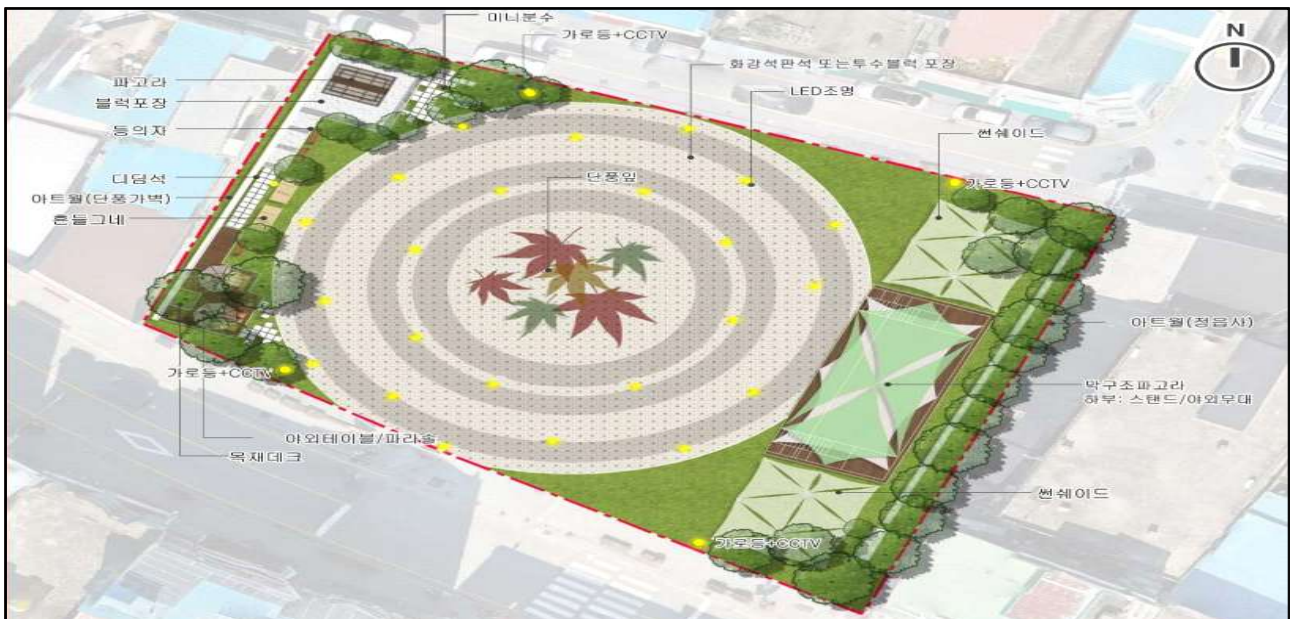

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 정읍시 수성동 558-2(구· 정읍우체국)
- 총사업비 : 2,100백만원(철거 : 1,000백만원, 광장조성 : 1,100백만원)
- 사업규모 : 구· 정읍우체국 철거 및 광장조성 1식
- 사업내용
  - 건물 4동 철거(총 연면적 2650㎡)
  - 광장(1965.6㎡), 조경 및 편의시설 1식

## ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계  | 2,100            | 0   | 0     | 0     | 1,000 | 200   | 900   | 0           |
| 국비 | 900              |     |       |       |       |       | 700   |             |
| 특금 | 1,000            |     |       |       | 1,000 |       |       |             |
| 시비 | 400              |     |       |       |       | 200   | 200   |             |

## ◆ 추진실적

- 구)정읍우체국 청사 및 부지 매입(회계과) ..... ’ 23. 6월  
- 매입대금 7,557백만원(토지 7,022백만원, 건물 535백만원)
- 공유재산 인계(회계과→도시과) ..... ‘25. 1월
- 지역주민 설문 조사 및 사업 설명회(새암로, 중앙로 상인회) · ‘25. 4월
- 시의회 간담회 및 총괄계획가 자문 ..... ‘25. 5월
- 지역수요맞춤지원(소규모) 공모 신청(국토부) ..... ‘25. 5월
- 구)정읍우체국 철거 완료 ..... ‘25. 2 ~ 6월
- 기본 및 실시설계용역 시행 ..... ‘25. 7 ~ 12월
- 지역수요맞춤지원(소규모) 공모 최종 선정(국토부) ..... ‘25. 8월
- 지역개발사업구역 지정용역 시행 ..... ‘25. 9 ~ 12월
- 기본계획 수립 위한 주민의견 수렴 ..... ‘25. 10 ~ 11월

## ◆ 금후계획

- 사업구역 지정 및 설계용역 완료 ..... ‘26. 1월
- 새암달빛광장 조성사업 시행 ..... ‘26. 3 ~ 12월

# 60-1


## 정읍역 활성화 및 서남권교통 거점화

| 분야<br>(분류번호)           | 완료<br>목표연도 | 예산 | 진도율  | 추진상황 | 도시과 |      |
|------------------------|------------|----|------|------|-----|------|
|                        |            |    |      |      | 직 위 | 전화번호 |
| 도시·교통<br>환경<br>(6-7-1) | 2024년      | 시비 | 100% | 완료   | 과 장 | 5036 |
|                        |            |    |      |      | 팀 장 | 5801 |
|                        |            |    |      |      | 담당자 | 5802 |

### ◆ 목 표

- 정읍역 광장의 환경정비와 불편 최소화로 쾌적한 환경 제공
- 공연장 및 플라마켓 등 활용으로 서남권 교통 거점화 도모

### ◆ 개 요

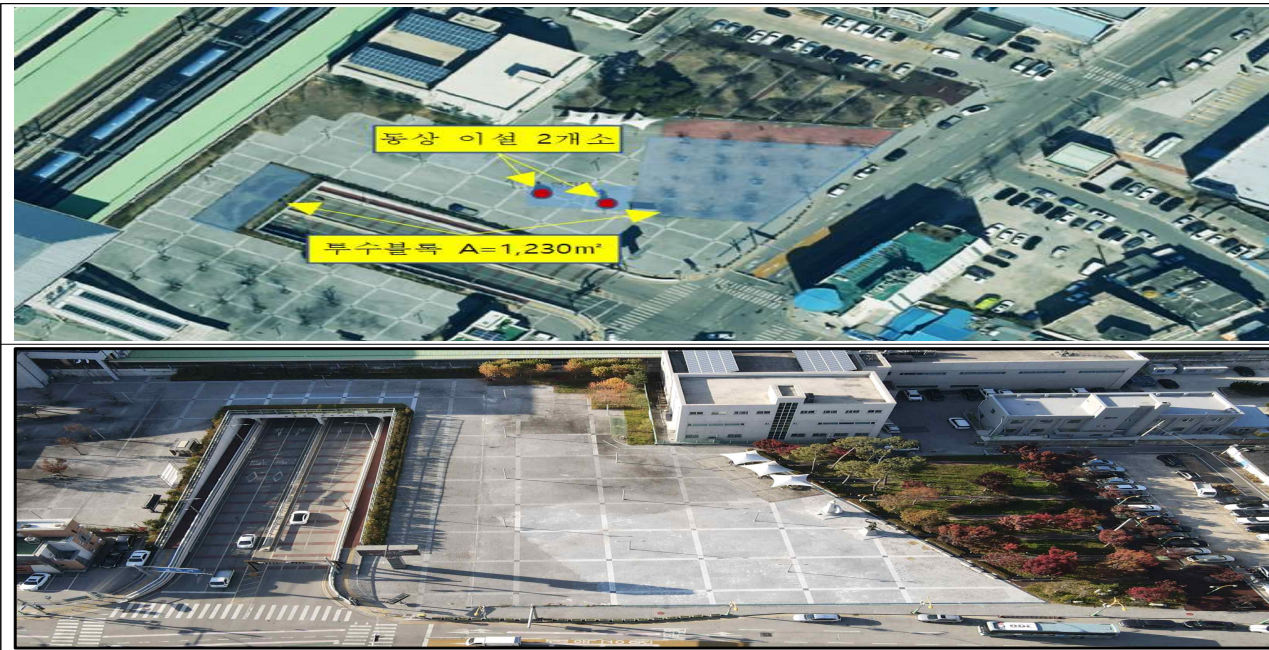

- 위 치 : 정읍역 광장 지하차도 일원(연지동 343-1, 343-383번지)
- 기 간 : 2023. 1월 ~ 2024년 12월(2년)
- 총사업비 : 220백만원(시비)
  - 2023년 : 70백만원 / 2024년 : 150백만원
- 주요내용 : 정읍역 광장 정비 1식
  - 투수블록 A=1,230㎡, 동상이설 등

## ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계  | 220              | 0   | 0     | 70    | 150   | 0     | 0     | 0           |
| 시비 | 220              |     |       | 70    | 150   |       |       |             |

## ◆ 추진실적

- 2023년 중기지방재정계획 승인 ..... ’ 22. 11월
- 코레일, 국가철도공단, 정읍시 합의 ..... ’ 22. 12월
- ‘정읍역광장 활성화 토론회’ 개최 ..... ’ 22. 12월
- 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 ..... ’ 23. 04월
  - 정읍천~정읍역 관광 핫플레이스 사업 연계하여 효과적인 사업 추진
- 기본계획 및 실시설계 용역 착수 ..... ’ 23. 05월
- 관계기관(한국철도공사) 협의 ..... ’ 23. 11월
- 정읍역 광장 조성 추진계획 보고(사업계획 변경건) ..... ’ 23. 12월
  - 당초 : 지하차도 복개 L=20m → 변경 : 광장정비 1식
  - 사유 : 복개부분 도로높이 확보로 단차 2m 발생, 광장 일원화 불가 → 사업효과 미비
- 정읍역 광장 지하차도 복개 사업비 삭감(15억) ..... ’ 23. 12월
- 2024년 제1회추경 예산 확보(1억5천만원) ..... ’ 24. 5월
- 정읍역 광장 정비사업 착공 ..... ’ 24. 9월
- 정읍역 광장 정비사업 준공 ..... ’ 24. 11월

## ◆ 문제점 및 대책

- 해당없음

## 60-2

# 정읍역 활성화 및 서남권교통 거점화

| 분야<br>(분류번호)        | 완료<br>목표연도 | 예산 | 진도율  | 추진상황 | 교통과 |      |
|---------------------|------------|----|------|------|-----|------|
|                     |            |    |      |      | 직위  | 전화번호 |
| 도시·교통·환경<br>(6-7-2) | 2024년      | 시비 | 100% | 완료   | 과장  | 5039 |
|                     |            |    |      |      | 팀장  | 5941 |
|                     |            |    |      |      | 담당자 | 5944 |

### ◆ 목 표

- 정읍역 주변 주차 불편을 최소화하여 정읍시민과 정읍역 관광객들에게 쾌적한 환경을 제공, 전북 서남권 교통 거점화 도모

### ◆ 위 치 도



### ◆ 개 요

- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2024. 8.
- 사업위치 : 연지동 370-5
- 총사업비 : 360백만원(시비)
  - 2025년 사업비 : 13백만원(시비)
- 사업규모 : 주차장조성 3,355㎡ / 주차면수 122대
- 사업내용 : 아스콘포장 3,355㎡, 옹벽설치 150m, 주차관제시스템 설치

## ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 시비 | 360              | -   | -     | 308   | 13    | 13    | 13    | 13          |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 임시공영주차장 부지 협의 ..... ’ 22. 10 ~ 11월

### 【2023. 1 ~ 12월】

- 국가철도공단 관리부지 사용 허가 ..... ’ 23. 4월
- 실시설계용역 완료 ..... ’ 23. 6월
- 공사 착공 ..... ’ 23. 9월
- 공사 중지(동절기) ..... ’ 23. 11월
- 공사 재착공 ..... ’ 24. 2월
- 공사 중지(관계기관 협의) ..... ’ 24. 3월

### 【2024. 1 ~ 12월】

- 공사 재착공 ..... ’ 24. 7월
- 공사 준공 ..... ’ 24. 8월
- 유료화 홍보(현수막 게시, 이통장 회보, 홈페이지 등) ’ 25. 1. 10. ~ 2. 2.

## ◆ 금후계획

- 주차장 유료화 운영 ..... 연중

| 분 야<br>(분류번호)     | 완 료<br>목표연도 | 예산 | 진도율  | 추진상황 | 교 통 과 |      |
|-------------------|-------------|----|------|------|-------|------|
|                   |             |    |      |      | 직 위   | 전화번호 |
| 도시·교통·환경<br>(6-8) | 2024년       | 시비 | 100% | 완료   | 과 장   | 5039 |
|                   |             |    |      |      | 팀 장   | 5921 |
|                   |             |    |      |      | 담당자   | 5922 |

## ◆ 목 표

- 택시 운수종사자의 근로여건 개선으로 피로감 해소 및 안전사고예방
- 택시 운수종사자 복지향상을 위한 시설 및 환경을 제공, 삶의 질과 운송 서비스 향상 기대

## ◆ 개 요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 규모/시설 : 부지면적 260㎡(78평), 건축연면적 182,8㎡(55평)
- 위 치 : 정읍시 연지동 343-411번지
- 총사업비 : 743백만원(시비)
  - 2025년 사업비 : 7백만원(시비)
- 내 용 : 1층(사무실, 휴게실), 2층(체력단련실, 샤워실) 쉼터

## ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 시비 | 743              | -   | -     | 700   | 22    | 7     | 7     | 7           |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 택시 운수종사자 쉼터 조성 계획 수립 ..... ’ 22. 8월
- 공유재산 심의 완료 ..... ’ 22. 10. 27.
- 타시군 벤치마킹(경기도 안산시 외 4개소) 추진 ..... ’ 22. 12월

### 【2023. 1 ~ 12월】

- 택시 쉼터조성에 관한 의견수렴(개인, 법인택시 대표) ..... ’ 23. 1. 6.
- 실시설계 용역 ..... ’ 23. 4 ~ 6월
- 공사계약 및 착공 ..... ’ 23. 8월
- 공사 준공(감독관, 감리, 시행사, 계약팀장) 검사 ..... ’ 23. 12. 6.
- 시장님 쉼터 현장방문 ..... ’ 23. 12. 14.
- 물품구입 ..... ’ 23. 12. 29.
  - 안마기 3대, 운동기구 7종(레그프레스머신 등), 1,2층 블라인드 설치 등

### 【2024. 1 ~ 현재】

- 택시 운수종사자 쉼터 내·외부간판 제작·설치 ..... ’ 24. 1. 11.
- 전기충전소 설치(자원순환과 1대) ..... ’ 24. 3월
- 택시 운수종사자 쉼터 조례 제정 ..... ’ 24. 4월
- 택시 운수종사자 쉼터 운영비 확보 ..... ’ 24. 5월
- 택시 운수종사자 쉼터 운영 ..... ’ 24. 6. 1.
  - 개인택시단위조합 사용허가 ( ’ 24. 6. 1. ~ 12. 31.)
- 운동기구 추가 구입(아령운동 세트, 헬스사이클) ’ 24. 7월/12월
- 택시 운수종사자 쉼터 운영 ..... ’ 25. 1월 ~
  - 개인택시단위조합 사용허가 ( ’ 25. 1. 1. ~ 12. 31.)
  - 공공운영비 지원(전기요금, 상하수도요금), 택시 단체 요구사항 반영

## ◆ 금후계획

- 택시 운수종사자 쉼터 운영 ..... 계속

| 분 야<br>(분류번호)   | 완 료<br>목표연도 | 예산             | 진도율  | 추진상황 | 교통과 |      |
|-----------------|-------------|----------------|------|------|-----|------|
|                 |             |                |      |      | 직 위 | 전화번호 |
| 도사교통환경<br>(6-9) | 2023년       | 도비, 시비,<br>자부담 | 100% | 완료   | 과 장 | 5039 |
|                 |             |                |      |      | 팀 장 | 5911 |
|                 |             |                |      |      | 담당자 | 5914 |

### ◆ 목 표

- 우리시 관문인 시외버스 공용터미널 환경개선을 통한, 이용객 편의 제공 및 방문객에게 호감을 주는 정읍 이미지 제고

### ◆ 개 요

- 기 간 : 2023. 2 ~ 12월
- 대 상 : 정읍 시외버스 공용터미널
- 사 업 비 : 77백만원(도 27 / 시 35 / 자부담 15)
- 주요내용 : 터미널 화장실 등 시설 보수, 캐노피 기둥 도색, 대합실 정비 등

### ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분          | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|-------------|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계           | 77               | -   | -     | 77    | -     | -     | -     | -           |
| 도비          | 27               | -   | -     | 27    | -     | -     | -     | -           |
| 시비          | 35               | -   | -     | 35    | -     | -     | -     | -           |
| 기타<br>(자부담) | 15               | -   | -     | 15    | -     | -     | -     | -           |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 23년 여객자동차터미널 정비사업 도비 신청 ..... ’ 22. 8월
- 23년 여객자동차터미널 정비사업비 확정 ..... ’ 22. 11월

### 【2023. 1 ~ 12월】

- 터미널 환경개선을 위한 사전협의 ..... ’ 23. 2월
- 터미널 환경개선 보조금 교부결정 ..... ’ 23. 3월
- 터미널 환경개선 사업추진 ..... ’ 23. 3~4월
  - 터미널 화장실, 출입문, 난방시설 및 외벽 송판 보수, 캐노피 기둥 도색 등
- 터미널 환경개선 사업 완료 및 보조금 정산 ..... ’ 23. 4월
- 터미널 환경개선 보조금 교부결정(2차) ..... ’ 23. 8월
- 터미널 환경개선 사업추진 ..... ’ 23. 8월
  - 터미널 감시카메라(CCTV) 보수
- 터미널 환경개선 사업 완료 및 보조금 정산 ..... ’ 23. 9월

## ◆ 문제점 및 대책

- 터미널의 환경개선 및 보수는 1회성으로 끝나지 않고 지속적으로 필요한 사업
  - ▶ 보조금 지원이 필요한 터미널 정비사업인 경우 전북특별자치도의 여객자동차터미널 정비사업 계획시 도비 및 예산확보를 통해 지원

| 분 야<br>(분류번호)    | 완 료<br>목표연도 | 예산  | 진도율  | 추진상황 | 교 통 과 |      |
|------------------|-------------|-----|------|------|-------|------|
|                  |             |     |      |      | 직 위   | 전화번호 |
| 도사교통환경<br>(6-10) | 2023년       | 비예산 | 100% | 완료   | 과 장   | 5039 |
|                  |             |     |      |      | 팀 장   | 5911 |
|                  |             |     |      |      | 담당자   | 5914 |

## ◆ 목 표

- 시민 대중교통 수요에 맞는 시내버스 운행 개편을 통해 대중교통 이용 활성화 도모

## ◆ 개 요

- 운 행 사 : (주)대한고속(대표이사 이호진)
- 인력현황 : 90명(운전직 81명, 정비직 2명, 관리직 7명)
- 운행대수 : 53대(운행 51대, 예비 2대)
- 운행노선 : 228개 노선/4,883.5km ※ 벽지노선 : 68개 노선/304.1km
- 주요내용 : 시내버스 배차시간 및 노선 현실화

## ◆ 추진실적

### 【2024. 1 ~ 현재】

- 정일중 시내버스 노선 협의 간담회 ..... ' 24. 6. 18.  
⇒ 통학버스 운행에 따라 기존 하교 시간대 2개 노선 통합 운행
- 소성 205번 노선 조정에 대한 협의 ..... ' 24. 7. 22.  
⇒ 기존 노선 이용을 하는 주민들의 반대로 노선 조정 불가

### 【이전 협의사항】

- 상교동 월천마을 노선 조정 주민 간담회(2회) ⇒ 노선 조정 완료
- 상교동 진산마을 배차시간 조정 주민 간담회(3회) ⇒ 배차시간 및 노선조정 완료
- 첨단 LH행복주택@ 노선 증설 요구에 따른 실차조사 및 타협회 개최 완료  
⇒ 1회 평균 0.9명 승차로 증설 불가
- 덕천면 장문마을 안길 버스 경유 주민 간담회(4회)  
⇒ 노선조정 불가, 복지택시 추가 배치를 통해 민원 해결
- 산내면 황토마을 임실 농어촌버스 노선 운행 협의(3회) ⇒ 토요일 버스 운행 완료
- 내장산 실버아파트 시내버스 경유 협의(2회) ⇒ 노선 조정 완료
- 정일중 시내버스 노선 협의 간담회 ⇒ 노선 조정 완료
- 소성 205번 노선 조정에 대한 협의 ⇒ 기존 노선 이용 주민들의 반대로 노선조정 불가

## ◆ 금후계획

- 배차시간 및 노선 현실화를 위한 주민 의견수렴 및 간담회 개최 ..... 수시

| 분 야<br>(분류번호)    | 완 료<br>목표연도 | 예산     | 진도율  | 추진상황         | 교 통 과 |     |      |
|------------------|-------------|--------|------|--------------|-------|-----|------|
|                  |             |        |      |              | 직 위   | 성 명 | 전화번호 |
| 도사교통환경<br>(6-11) | 2025년       | 도비, 시비 | 100% | 이행 후<br>계속추진 | 과 장   | 안석주 | 5039 |
|                  |             |        |      |              | 팀 장   | 박정규 | 5921 |
|                  |             |        |      |              | 담당자   | 한인철 | 5922 |

### ◆ 목 표

- 다양한 운송체계로 대중교통 취약 지역 주민 및 중고등학생들의 이동권 보장
- 운수종사자의 실질적인 수익증대와 질 높은 택시 교통서비스 제공

### ◆ 개 요

- 기 간 : 2024 ~ 2025년
- 규 모 : 513대(개인 345, 법인 168)
- 총사업비 : 2,734백만원(도 360, 시 2,374)
  - 2025년 사업비 : 469백만원(도 62, 시 407)
- 주요내용 : 관제센터 운영비, 통신비, 카드수수료, 단말기 통신비 등 지원

### ◆ 재원조달계획

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계  | 2,734            | -   | 400   | 450   | 477   | 469   | 469   | 469         |
| 도비 | 360              | -   | 60    | 60    | 42    | 62    | 68    | 68          |
| 시비 | 2,374            | -   | 340   | 390   | 435   | 407   | 401   | 401         |

### ◆ 추진실적

【2022. 1 ~ 12월】

- 2022년 콜센터 운영비, 통신비 등 지원 …… 200백만원/’ 22. 1월
  - 운영비(내장산콜 120, 연합콜 40), 통신비(내장산콜 30, 연합콜 10)
- 2022년 택시요금 카드수수료 및 통신비 지원월 5,500원 200백만원/’ 22. 7월, 12월

**【2023. 1 ~ 12월】**

- 2023년 콜센터 운영비, 통신비 등 지원 ..... 250백만원/’ 23. 1월
  - 운영비(내장산콜 135, 연합콜 75), 통신비(내장산콜 30, 연합콜 10)
- 2023년 택시요금 카드수수료 및 통신비 지원(월 5,500원) 200백만원/’ 23. 7월, 12월

**【2024. 1 ~ 12월】**

- 2024년 콜센터 운영비, 통신비 등 지원 ..... 250백만원/’ 24. 1월
  - 운영비(내장산콜 135, 연합콜 75), 통신비(내장산콜 30, 연합콜 10)
- 2024년 택시요금 카드수수료 및 통신비 지원(월 5,500원) 227백만원/’ 24. 7월, 12월

**【2025. 1 ~ 12월】**

- 2025년 콜센터 운영비, 통신비 등 지원 ..... 250백만원/’ 25. 1월
  - 운영비(내장산콜 135, 연합콜 75), 통신비(내장산콜 30, 연합콜 10)
- 2025년 택시요금 카드수수료 및 통신비 지원(월 5,500원) 219백만원/’ 25. 7월, 12월

**◆ 금후계획**

- 2026년 콜센터 운영비, 통신비 등 지원 ..... 250백만원/’ 25. 1월
  - 운영비(내장산콜 135, 연합콜 75), 통신비(내장산콜 30, 연합콜 10)
- 2026년 택시요금 카드수수료 및 통신비 지원(월 5,500원) 219백만원/’ 25. 7월, 12월

| 분 야<br>(분류번호)      | 완 료<br>목표연도 | 예산            | 진도율  | 추진상황         | 교 통 과 |      |
|--------------------|-------------|---------------|------|--------------|-------|------|
|                    |             |               |      |              | 직 위   | 전화번호 |
| 도사교통환경<br>(6-12-1) | 2026년       | 국비, 도비,<br>시비 | 100% | 이행 후<br>계속추진 | 과 장   | 5039 |
|                    |             |               |      |              | 팀 장   | 5941 |
|                    |             |               |      |              | 담당자   | 5942 |

## ◆ 목 표

- 보호구역 내 노후된 각종 교통시설물의 신속한 정비로 교통사고 사전 예방 및 안전하고 편리한 교통환경 조성
- 노인보호구역과 마을주민 교통사고 위험지역 교통안전시설물 설치로 보행자의 안전 확보와 교통약자의 소중한 생명보호
- 등록 자동차 증가에 따른 도심지역 부족한 주차공간을 확보, 시민 주차불편 해소 및 지역경제 활성화 도모

## ◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년
- 대 상 : 정읍시 관내 보호구역 및 공영주차장 일원
- 총사업비 : 35,180백만원(국 1,300, 도 6,211, 시 27,669)  
- 2025년 : 5,533백만원(도 1,208 시 4,325)

## ◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계  | 35,180           | 0   | 3,395 | 5,814 | 9,646 | 5,533 | 5,396 | 5,396       |
| 국비 | 1,300            | -   | 900   | 200   | 200   | -     | -     | -           |
| 도비 | 6,211            | -   | 156   | 1,372 | 1,765 | 1,208 | 855   | 855         |
| 시비 | 27,669           | -   | 2,339 | 4,242 | 7,681 | 4,325 | 4,541 | 4,541       |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 새암로 도심 공영주차장 조성사업 준공 ..... '22. 7월  
- 공영주차장 조성 A=837㎡, 주차면수 24면 / 176백만원
- 각시다리 도심 공영주차장 조성사업 준공 ..... '22. 10월  
- 공영주차장 조성 A=1,239㎡, 주차면수 29면 / 127백만원
- 어린이보호구역 적색신호등 설치 사업 ..... '22. 12월  
- 교암초 외 16개소 / 61백만원 / 적색신호등 교체 16개소, 신호등 철거 3개소
- 2022년 마을주민 보호구간 조성사업 ..... '22. 12월  
- 이평면 창전마을, 태인면 공사마을 / 350백만원 / 표지판 설치(시·중점 표지판 등) 35개, 차선도색 A=488㎡ 등

### 【2023. 1 ~ 12월】

- 서부로 노상주차장 조성사업 ..... '23. 8월  
- 도로노면표시재정비 L=300m, 주차면수 25면 / 27백만원
- 동초등학교 사거리 정비사업 ..... '23. 10월  
- 정읍동초교 / 91백만원 / 차선도색 A=801㎡, 미끄럼방지포장 A=1,033㎡ 등
- 2023년 마을주민 보호구간 조성사업 ..... '23. 10월  
- 원상평마을 / 180백만원 / 투광등 설치 3EA, 미끄럼방지포장 A=1,053㎡ 등
- 장명동 동초교앞 공영주차장 조성사업 준공 ..... '23. 11월  
- 임시공영주차장 조성 A=668㎡, 주차면수 20면 / 67백만원
- 서영여고 후문 공영주차장 조성사업 준공 ..... '23. 12월  
- 임시공영주차장 조성 A=805㎡, 주차면수 23면 / 70백만원

### 【2024. 1 ~ 12월】

- 상동 영무예다음 임시공영주차장 조성사업 준공 ..... '24. 4 ~ 6월  
- 임시공영주차장 조성 A=1,602㎡, 주차면수 51면 / 44백만원
- 부영2차 후문앞 임시공영주차장 조성사업 준공 ..... '24. 4 ~ 6월  
- 임시공영주차장 조성 A=652㎡, 주차면수 20면 / 16백만원
- 미소거리 공영주차장 조성사업 준공 ..... '24. 7월  
- 공영주차장 조성 A=2,420㎡, 주차면수 75면 / 334백만원
- 개구리주차장 개선사업 준공 ..... '24. 7 ~ 9월  
- 험프경계석 교체 L=244m(연지동 26-1번지 일원) / 45백만원

- 하나로마트 옆 공영주차장 조성사업 준공 ..... '24. 7 ~ 9월  
- 공영주차장 조성 A=1,375㎡, 주차면수 41면 / 243백만원
- 중앙3길 공영주차장 조성사업 준공 ..... '24. 7 ~ 10월  
- 공영주차장 조성 A=55㎡, 주차면수 9면 / 54백만원
- 부영1차 앞 공영주차장 조성사업 준공 ..... '24. 9 ~ 10월  
- 공영주차장 조성 A=305㎡, 주차면수 12면 / 28백만원
- 2024년 상·하반기 어린이보호구역 개선사업 ..... '24. 5월/12월  
- 덕천초 외 26개소 / 853백만원 / 방호울타리 L=1,186m, 미끄럼방지포장 A=2,862㎡, 노면표시 A=4,808㎡ 등
- 어린이보호구역 스마트횡단보도 설치사업 ..... '24. 10월  
- 정읍동초교 / 100백만원 / 정지선자감이 시스템 1식, 보행신호음성안내보조장치 10대

**【2025. 1 ~ 11월】**

- 주차장 수급 및 안전관리 실태조사 수립용역 시행 ..... '25. 1 ~ 7월
- 신태인읍 공영주차장 조성사업 준공 ..... '25. 4월  
- 공영주차장 조성 3,107.7㎡, 86면 / 249백만원
- 어린이보호구역 과속경보시스템 설치 사업 ..... '25. 5월  
- 수성초 외 4개소 / 100백만원 / 과속경보시스템 설치 10대
- 어린이보호구역 개선사업(정읍북초교) ..... '25. 5월  
- 정읍북초교 / 80백만원 / 인도정비 L=136m, 방호울타리 L=342.0m
- 2025년 상반기 어린이보호구역 개선사업 ..... '25. 6월  
- 한솔초 외 6개소 / 45백만원 / 차선도색 A=544㎡, 표지판 이설 등
- 샘고을시장1 공영주차장 조성사업 준공 ..... '25. 6월  
- 공영주차장 조성 417㎡, 13면 / 268백만원
- 국제사진관 뒤 공영주차장 조성사업 준공 ..... '25. 6월  
- 공영주차장 조성 695㎡, 18면 / 204백만원
- 초산동 옆 임시공영주차장 조성사업 준공 ..... '25. 7월  
- 임시공영주차장 조성 432㎡, 12면 / 18백만원
- 2025년 노인보호구역 개선사업 ..... '25. 8월  
- 정읍시노인복지관 외 5개소 / 10백만원 / 기·종점 노면표시
- 새싹유치원 어린이보호구역 해제 정비 공사 ..... '25. 9월  
- 구새싹유치원 어린이보호구역 / 61백만원 / 차선도색 A=664㎡, 표지판 설치 9개 등

- 어린이보호구역 무인교통단속장비 설치 ..... '25. 10월
  - 과교어린이집 / 50백만원 / 과속단속카메라 설치 2대
- 2025년 하반기 어린이보호구역 개선사업 ..... '25. 10월
  - 동신초 외 8개소 / 54백만원 / LED 표지판 설치 6개, 방호울타리 설치 L=60m 등
- 어린이보호구역 개선사업(보조) ..... '25. 10월
  - 정읍남초 외 17개소 / 150백만원 / 인도장비 및 방호울타리 교체, 가·중점 노면표시 등
- 보호구역(어린이·노인) 실태조사 사업 ..... '25. 11월
  - 어린이보호구역 39개소, 노인보호구역 6개소 / 105백만원 / 보호구역 내 교통환경, 시설물 등 실태조사

### ◆ 금후계획

- 소명교회 인근 공영주차장 조성사업 ..... '26. 2월
  - 공영주차장 조성 A=1,409㎡, 38면 / 1,026백만원
- 샘고을시장2 공영주차장 조성사업 ..... '26. 2 ~ 6월
  - 공영주차장 조성 A=439㎡, 11면 / 848백만원
- 시기동 공영주차장 조성사업 ..... '26. 2 ~ 6월
  - 공영주차장 조성 A=1,565㎡, 55면 / 1,450백만원
- 터미널 사거리 주차타워 조성사업 ..... '25. 9월 ~ '26. 12월
  - 주차타워 건축 2,483㎡, 126면 / 5,420백만원(도2,710, 시2,710)
- 현대1차아파트앞 공영주차장 조성사업 ..... '26. 2 ~ 11월
  - 공영주차장 조성 A=1,697㎡, 48면 / 1,818백만원
- 현대3차아파트뒤 공영주차장 조성사업 ..... '26. 2 ~ 11월
  - 공영주차장 조성 A=1,184㎡, 33면 / 1,303백만원
- 칠보초등학교옆 공영주차장 조성사업 ..... '26. 2 ~ 11월
  - 공영주차장 조성 A=437, 14면 / 58백만원

### ◆ 문제점 및 대책

- 도심지역 일정규모의 주차장을 조성할 수 있는 부지가 부족하고, 토지매입 비용 상승으로 시 예산부담 가중
  - ▣ 활용가능한 빈집 등 나대지를 조사·매입 또는 부지 임대 후, 주차장 조성 확대

| 분야<br>(분류번호)              | 완료<br>목표연도 | 예산 | 진도율  | 추진상황        | 건설과 |      |
|---------------------------|------------|----|------|-------------|-----|------|
|                           |            |    |      |             | 직 위 | 전화번호 |
| 도시·교통<br>· 환경<br>(6-12-2) | 2026년      | 시비 | 100% | 이행후<br>계속추진 | 과 장 | 5037 |
|                           |            |    |      |             | 팀 장 | 5851 |
|                           |            |    |      |             | 담당자 | 5853 |

### ◆ 목 표

- 안전한 보행환경 및 인도 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 보행환경 유지
- 도로에 설치된 과속방지턱에 대하여 도로법 규격에 맞게 재정비

### ◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 위 치 : 정읍시 시가지 내
- 총사업비 : 11,094백만원(시 11,094)  
- 2025년 사업비 : 510백만원(시 510)
- 내 용 : 인도정비 및 과속방지턱 설치(정비)
  - 정읍시 관내 과속방지턱 1,012개소

| 총 계   | 양호  | 정비대상 |                |     | 비고 |
|-------|-----|------|----------------|-----|----|
|       |     | 계    | 파손 및<br>경사로 미흡 | 재도색 |    |
| 1,012 | 829 | 183  | 62             | 121 |    |

- 과속방지턱 매년 40개소 신설 및 100개소 정비 추진 계획
- 정읍시 인도 현황 124.56km(시내권 82.07km, 시외권 42.49km)
  - 인도 정비 매년 5개소(약 2km) 정비(매년 1,500백만원 목표)

### ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총 사업비<br>(기투자제외)  | 기투자   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 ~ |
|----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 시비 | 11,094<br>(8,015) | 3,079 | 1,550 | 3,570 | 580   | 510   | 865   | 940     |

## ◆ 추진실적

### 【2022 ~ 2025년도 추진】

- 과속방지턱 실태조사 완료 ..... '22. 9월
- 과속방지턱 정비 및 신설 : 총 324개소, 950백만원 ..... '22 ~ '24년
- 인도 정비 : 총 31개소 / 5,260백만원 ..... '22 ~ '24년
  - 북면소재지(북면우체국~정읍한우) 인도정비공사 등 31개소 추진 완료
- '25년 인도정비공사 과속방지턱 신설 및 정비 ..... '25. 1 ~ 12월
  - 인도정비 : 5개소, 310백만원
  - 과속방지턱 : 19개소 신설, 정비 16개소, 100백만원

## ◆ 금후계획

- 실시설계 완료 및 공사발주 ..... '26. 3월
  - 인도 정비 공사 : 9개소, 665백만원
  - 과속방지턱 신설 및 정비 : 50개소, 200백만원
- 인도 정비 공사 및 과속 방지턱 정비 추진 ..... '26. 3 ~ 12월

| 분 야<br>(분류번호)      | 완 료<br>목표연도 | 예산            | 진도율  | 추진상황 | 상하수도사업소 |      |
|--------------------|-------------|---------------|------|------|---------|------|
|                    |             |               |      |      | 직 위     | 전화번호 |
| 도사교통환경<br>(6-13-1) | 2024년       | 국비, 도비,<br>시비 | 100% | 완료   | 소 장     | 5050 |
|                    |             |               |      |      | 팀 장     | 6471 |
|                    |             |               |      |      | 담당자     | 6472 |

## ◆ 목 표

- 지방상수도 관로 노후로 인하여 유수율 제고 한계가 발생하고, 수질문제가 점진적으로 증가하고 있어 노후관 교체를 통한 유수율 제고 및 수질문제 해결

## ◆ 개 요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
- 대 상 : 정읍시 일원(마곡·장명(배) 주배수관로 및 4개 소블록)
- 사 업 비 : 24,600백만원(국비 12,300, 도비 2,460, 시비 9,840)
- 사업내용 : 노후 상수도관 L=21.3km 교체·정비, 밸브실 신설 등

## ◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외)  | 기투자   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계  | 24,600<br>(210)   | 9,840 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | -     | -     | -           |
| 국비 | 12,300<br>(7,380) | 4,920 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | -     | -     | -           |
| 도비 | 2,460<br>(1,476)  | 984   | 492   | 492   | 492   | -     | -     | -           |
| 시비 | 9,840<br>(5,904)  | 3,936 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | -     | -     | -           |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 노후관로 교체공사(1단계) 준공 ..... '22. 6월
  - 상수도관 교체 L=8.7km(장명 주배수관로 및 장명3블록)
- 노후관로 교체공사(2단계) 실시설계 완료 ..... '22. 9월

### 【2023. 1 ~ 12월】

- 노후관로 교체공사(2단계) 착공 ..... '23. 2월
  - 상수도관 교체 L=7.2km(마곡·장명 주배수관로)

### 【2024. 1 ~ 12월】

- 노후관로 교체공사(2단계) 준공 ..... '24. 12월
  - 상수도관 교체 5.4km(마곡배수지~동초사거리) / 공정률 : 100%

| 분 야<br>(분류번호)      | 완<br>목표연도 | 예산            | 진도율  | 추진상황         | 상하수도사업소 |      |
|--------------------|-----------|---------------|------|--------------|---------|------|
|                    |           |               |      |              | 직 위     | 전화번호 |
| 도시교통환경<br>(6-13-2) | 2026년     | 국비, 도비,<br>시비 | 100% | 이행 후<br>계속추진 | 소 장     | 5050 |
|                    |           |               |      |              | 팀 장     | 6491 |
|                    |           |               |      |              | 담당자     | 6492 |

## ◆ 목 표

- 노후 하수관로 정밀조사 결과 도출된 문제점을 개선함으로써 노후 및 손상된 하수관로를 전반적으로 개·보수 조치

## ◆ 개 요

- 기 간 : 2021년 ~ 2026년(6년)
- 위 치 : 정읍시 일원(수성동, 장명동, 내장상동, 시기동, 초산동, 연지동)
- 사 업 비 : 7,933백만원(국비 3,957, 도비 397, 시비 3,579)
  - 2025년 : 3,754백만원(국비 2,572, 도비 258.3, 시비 923.7)
- 사업내용
  - 굴착보수 : D200 ~ D1200 L=747m
  - 비굴착보수 : 원형관 - 전체보수 L=127.5m, 부분보수 389개소  
수로암거 - 전체보수 L=1,605.3m, 부분보수 10.8<sup>m³</sup>

## ◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비<br>(기투자 제외) | 기투자   | 2022년 | 2023년 | 2024년   | 2025년 | 2026년 | 2027년<br>이후 |
|----|------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------|
| 계  | 7,933<br>(6,933) | 1,000 | -     | 884   | 2,295   | 3,754 | -     | -           |
| 국비 | 3,957<br>(3,457) | 500   | -     | 142   | 743     | 2,572 | -     | -           |
| 도비 | 397<br>(347)     | 50    | -     | 14    | 74.7    | 258.3 | -     | -           |
| 시비 | 3,579<br>(3,129) | 450   | -     | 728   | 1,477.3 | 923.7 | -     | -           |

## ◆ 추진실적

### 【2022. 7 ~ 12월】

- 재원협의(재협의) ..... '22. 08월
- 설계용역 완료 ..... '22. 11월
- 행정절차(도원가심사) 이행 및 국비확보 ..... '22. 12월

### 【2023. 1 ~ 12월】

- 공사 착공 ..... '23. 1월
- 선금 지급 ..... '23. 5월
- 실시설계(도면) 보완 ..... '23. 6월
- 건설사업관리용역(1차분) 착수 ..... '23. 9월
- 공사(1차분) 준공 ..... '23. 12월

### 【2024. 1 ~ 12월】

- 공사(2차분) 착공 ..... '24. 3월
- 건설사업관리용역(1차분) 완료 ..... '24. 6월
- 건설사업관리용역(2차분) 착수 ..... '24. 6월
- 공사(2차분) 준공 ..... '24. 12월

### 【2025. 1 ~ 11월】

- 공사(3차분) 착공 ..... '25. 3월
- 건설사업관리용역(2차분) 완료 ..... '25. 5월
- 건설사업관리용역(3차분) 착수 ..... '25. 5월

## ◆ 금후계획

- 공사(3차분) 준공 ..... '26. 6월
- 건설사업관리용역(3차분) 완료 ..... '26. 8월
