

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	회계과	
					직 위	전화번호
도시·교통·환경 (6-1)	2026년	시비	100%	완료	과 장	5025
					팀 장	5321
					담당자	5322

◆ 목 표

- 정읍시 발전과 시민들의 삶의 질 향상을 위해 활용하고자 정읍 교육지원청 이전 부지를 매입하고자 함

◆ 개 요

- 사업기간 : 2023년
- 매입대상 : 구)정읍교육지원청 부지 및 건물
 - ┌ 토지 : 정읍시 상동 319-12번지 / 대지 / 4,161㎡(1,258평)
 - └ 건물 : 연면적 2,298.16㎡
- 사 업 비 : 4,945백만원(시비)
- 내 용 : 구)정읍교육지원청 부지 및 건물 매입
- 활용방안 : 리모델링 후 정읍시 평생학습관으로 활용

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
시비	4,945			4,945				

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사 ’ 22. 9월
- 공유재산관리계획 승인(시의회) ’ 22. 10월
- 부지 및 건물매입 협의(전북교육청) ’ 22. 7 ~ 12월
- 부지 및 건물매입비 2023년 본예산 반영 ’ 22. 10 ~ 12월

【2023. 1 ~ 12월】

- 매매계약 체결 및 소유권 이전 ’ 23. 2월
- 재산 인계(회계과 ⇒ 인재양성과) ’ 23. 3월
- 건물정밀안전진단 용역 시행(인재양성과) ’ 23. 4 ~ 6월
- 리모델링 실시설계 용역 시행(인재양성과) ’ 23. 9 ~ 12월

【2024. 1 ~ 12월】

- 리모델링 공사 시행(인재양성과) ’ 24. 1 ~ 8월
- 정읍시 평생학습관 개관(인재양성과) ’ 24. 9월

분야 (분류번호)	완료 목표연도	예산	진도율	추진상황	일자리경제과	
					직 위	전화번호
도시·교통· 환경 (6-2)	2028년	도비, 시비	70%	정상	과 장	5056
					팀 장	5621
					담당자	5622

◆ 목 표

- 연지시장 내 노후 기반시설 정비와 다양한 문화공간 조성으로 시장활성화를 도모하여 “가고 싶은 문화시장” 및 “전국 제일 명품시장”으로 발돋움

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2028년(7년)
- 대 상 : 연지시장 일원
- 사 업 비 : 5,000백만원(도 1,245, 시 3,755)
- 주요내용
 - ① 기반시설 정비(시설현대화) : 2,625백만원(도 1,245, 시 1,380)
 - ② 연지시장 정비방안 마련 및 종합발전계획 수립·시행

◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	5,000 (2,925)	2,075	550	-	-	100	-	2,275
도비	1,245 (0)	1,245	-	-	-	-	-	-
시비	3,755 (2,925)	830	550	-	-	100	-	2,275

◆ 추진실적(2022. 7 ~ 2026. 5.)

【2022. 7 ~ 12월】

- 기반시설 정비(시설현대화) '21 ~ '22년
 - 위 치 : 연지시장 중앙통로부(입구 ~ 소성그릇)
 - 사 업 비 : 2,625백만원(도비 1,245, 시비 1,380)
 - 사업내용 : 아케이드(막구조물) 개선, 간판 및 통로정비, 화장실 개선 등

【2023. 1 ~ 12월】

- 연지시장 번영회, 상인 등 발전 방향 논의 '23. 1~12월

【2024. 1 ~ 12월】

- 연지시장 실태조사(연혁, 현장조사, 실태조사서 작성) '24. 1~12월

【2025. 1 ~ 12월】

- 연지시장 번영회 등 주민 의견 수렴 '25. 3월
- 용역 예산 확보(1회 추경 / 100,000천원) '25. 6월
- 용역 발주 '25. 7월
- 연지시장 정비계획 수립용역 시행 '25. 11월 ~ '26. 10월

【2026. 1 ~ 5월】

- 번영회 및 시의회 간담회 '26. 1월
- 벤치마킹 실시(충주시, 익산시) '26. 3, 5월

◆ 금후계획

- 정비계획 수립 및 조례 제정 '26년
- 연지시장 현실화 대책 추진 '27 ~ '28년
- 연지시장 정비 및 공공개발 시행 '29 ~ '30년

◆ 문제점 및 대책

- 연지시장 실태조사 결과에 따른 공유재산(장옥) 관리 필요
 - ▶ 원활한 사업 추진을 위한 권리관계 파악 및 정비 시행
- 연지시장 개발 계획 다각적 분석 및 경제성 검토 필요
 - ▶ 개발계획 수립 및 경제성 등 분석을 위한 연지시장 정비계획 및 타당성 조사 용역 추진

분야 (분류번호)	완료 목표연도	예산	진도율	추진상황	환경정책과	
					직 위	전화번호
도사 교통 환경 (6-3)	2028년	국비, 도비, 시비	35%	정상	과 장	5034
					팀 장	5731
					담당자	5732

◆ 목 표

- 가축분뇨의 안전하고 효율적 처리로 수질개선 및 쾌적한 생활환경 조성
- 우분을 연료로 생산·사용함으로써 토양·수질 등 환경오염 방지

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2028년(7년)
- 대 상 : 영파동 404-9번지 일원(33,482㎡)
- 사 업 비 : 44,600백만원(국 34,600, 도 2,598, 시 7,402)
 - 2026년 : 8,463백만원(국 6,770, 도 508, 시 1,185)

◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	44,600 (44,600)	-	2,572	500	-	-	8,463	33,065
국비	34,600 (34,600)	-	250	500	-	-	6,770	27,080
도비	2,598 (2,598)	-	-	-	-	-	508	2,090
시비	7,402 (7,402)	-	2,322	-	-	-	1,185	3,895

◆ 추진실적(2022. 7 ~ 2026. 5.)

【2022. 7 ~ 12월】

- 지방재정 중앙투자 심사 통보 '22. 3월

【2023. 1 ~ 12월】

- 수요처 확보(군산 OCI SE외 2개소)를 위한 MOU체결 ' 23. 05월

【2024. 1 ~ 12월】

- 지방건설기술심의위원회 심의 ' 24. 01월
- 규제샌드박스 실증특례 산업통상자원부 승인 ' 24. 03월
- 기본 및 실시설계 착수 ' 24. 06월

【2026. 1 ~ 5월】

- 공법선정 ' 26. 01월
- 재해영향성검토 용역 준공 ' 26. 03월
- 환경영향평가 착수 ' 26. 04월

◆ 금후계획

- 주민설명회 ' 26. 07월
- 토지매입 협의 추진 ' 26. 12월
- 기본 및 실시설계 용역 준공 ' 26. 12월
- 공사 발주 및 착공 ' 27. 01월
- 공사 준공 및 시운전 ' 28. 12월

내장저수지 주변 생태 공원화로 힐링도시 (월영습지 및 솔티숲 생태관광지 육성)

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	환경정책과	
					직 위	전화번호
도시교통환경 (6-5-1)	2025년	국비, 군특, 도비, 시비	100%	완료 후 계속추진	과 장	5034
					팀 장	5701
					담당자	5703

◆ 목 표

- 월영습지, 솔티숲 등 다양한 생태자원을 활용 최적의 생태관광지 조성
- 주변 여러 생태·문화 자원을 연계한 생태탐방 프로그램을 개발·운영하여 지역 농특산품 판매 등 지역 주민소득 창출

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2027년(6년) / 국가생태관광지(2018 ~ 2026년)
- 위 치 : 송산동, 쌍암동 일원 10km² / 대표지점 솔티마을 주변
- 사 업 비 : 2,262백만원(국 241, 군특 890, 도 445, 시 686)
 - 2025년 : 1,132백만원(국 36, 군특 530, 도 265, 시 301)
- 사업내용 : 탐방로 신규 개설 및 관리, 방문자센터 운영, 생태관광 프로그램 운영 등

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	8,747 (2,262)	6,485	486	410	90	1,132	72	72
국비	406 (241)	165	43	45	45	36	36	36
군특	3,600 (890)	2,710	200	160	-	530	-	-
도비	1,900 (445)	1,455	100	80	-	265	-	-
시비	2,841 (686)	2,155	143	125	45	301	36	36

◆ 추진실적

- 솔티생태관광방문자센터 준공(개관 '23.6.) '22. 12월
- 국가생태탐방로(성지길) 조성공사 착공 '24. 1월
- 솔티생태관광방문자센터 운영시스템 구축사업 시행 ... '24. 1월
- 솔티생태관광방문자센터 다목적실 정비공사 착공 '24. 1월
- 솔티생태관광방문자센터 운영시스템 구축사업 완료 ... '24. 4월
- 솔티생태관광방문자센터 다목적실 정비공사 준공 '24. 6월
- 국가생태탐방로(성지길) 산지전용허가 완료(정읍국유림관리소) .. '24. 10월
- 국가생태탐방로(성지길) 공원사업 시행허가 완료(내장산국립공원사무소) · '24. 11월
- 국가생태탐방로(성지길) 추가공사 설계 완료 '24. 11월
- 국가생태탐방로(성지길) 추가공사 착공 '24. 12월
- 국가생태탐방로(성지길) 준공 '25. 8월
- 국가생태탐방로(보존길) 업무협약(정읍사·내장산국립공원사무소) ... '25. 10월
- 국가생태탐방로(보존길) 공원계획변경용역 착수 '25. 10월

◆ 금후계획

- 국가생태탐방로(보존길) 공원계획변경용역 완료 ' 26. 6월
- 국가생태탐방로(보존길) 위탁사업비 지급 ' 26. 7월
- 국가생태탐방로(보존길) 산지일시사용신고 및 사유지 협의 ... ' 26. 7월
- 국가생태탐방로(보존길) 준공 ' 27. 12월

58-2

내장저수지 주변 생태공원화로 힐링도시 (1. 내장산 수목원 정비)

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	산림녹지과	
					직 위	전화번호
도시·교통 · 환경 (6-5-2)	2024년	시비	100%	완료	부서장	5035
					팀 장	5691
					담당자	5693

◆ 개 요

- 기 간 : 2023. 2 ~ 11월 ※ 2023년 완료
- 위 치 : 쌍암동 405번지 일원
- 규 모 : 46,432㎡
- 주요내용 : 꽃무릇 확대 식재, 기존 산책로 정비, 노후 휴게시설 정비 등

〈 내장산 수목원 현황 〉

- 소 유 자 : 대상문화재단 (사립수목원) / (관리자 : 이성욱 010-4755-9383)
- 총 면 적 : 46,432㎡ (14,070평) ※ 조성년도 : 1993년
- 주요시설 : 잔디광장, 음수대, 산책로, 정자, 화장실 등
- ※ 등록 수목원 아님 (산림청, 전북)

- 사 업 비 : 200백만원(시 200)

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
시비	200(200)	-	-	200	-	-	-	-

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 토지소유주(대상문화재단) 토지사용 협의(2회) ... '22. 8월 / 10월
 - 토지사용승낙(무상사용 등) / 일반인 개방 조건 / 입목벌채 및 식재 등
- 공원지역 사전 행정절차 협의 완료(2회) '22. 8월 / 9월
 - 국립공원 내장산 사무소 협의
- '23년 사업 시행 본예산 요구(200백만원) '22. 11월

【2023. 1 ~ 5월】

- 소유주(대상문화재단) 협의(1차) '23. 1월
 - 정 읍 시 : 꽃무릇 식재 우선 추진
 - 대상문화재단 : 휴게시설 등 시설물 보수 여부 (상반기 확정)
- 꽃무릇 외 식재수종 검토 보고 '23. 2. 17. ~ 3. 14.

※ 「2023년 주요업무 계획보고」 시장님 당부사항(1. 16.)

- 꽃무릇을 제외한 다른 품종 식재 검토 보고 완료 ▣ 백양꽃 식재

- 일상감사 요청 및 회신 '23. 4. 12. ~ 4. 21.
- 소유주(대상문화재단) 유선 협의(2차) '23. 4. 24.
 - 수목원 내 휴게시설 등 시설물 보수 → 정읍시 시행 제안
- 내장산수목원 정비 시행 '23. 4. 26. ~ 6. 23.
 - 사업규모 : 4,450㎡ / 사업비 : 46백만원(도급액)
 - 사업내용 : 백양꽃(68,030본) 식재, 산책로 정비 471㎡ 등
- 내장산 수목원 배수로 등 정비공사 시행 '23. 7. 31. ~ 8. 30.
 - 사업내용 : 잔디수로(100m) 설치 등 / 사업비 : 6백만원(도급액)
- 내장산 수목원 백양꽃 보식 '23. 11월
 - 사업내용 : 백양꽃 20,000주 식재 / 사업비 : 14백만원(도급액)

58-2

내장저수지 주변 생태 공원화로 힐링도시 [2. 내장산 자연휴양림 조기 완공]

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	산림복지과	
					직 위	전화번호
도시·교통 ·환경 (6-5-2)	2024년	균특, 도비, 시비	100%	이행 후 계속추진	부서장	5035
					팀 장	5757
					담당자	5758

◆ 목 표

- 내장산 자연휴양림 조성으로 숲을 이용한 휴양공간 조성 및 산림복지서비스 제공

◆ 개 요

- 위 치 : 용산동 산50번지 일원
- 기 간 : 2020 ~ 2026년
- 규 모 : 시유지 487,878㎡(지정고시 면적)
- 사 업 비 : 17,500백만원(균특 4,750, 도 4,500, 시 8,250)
- 2025년 : 4,000백만원(도 2,000, 시 2,000)

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	17,500 (15,700)	1,800	7,700	-	4,000	4,000	-	-
균특	4,750 (3,850)	900	3,850	-	-	-	-	-
도비	4,500 (4,500)	-	-	-	2,500	2,000	-	-
시비	8,250 (7,350)	900	3,850	-	1,500	2,000	-	-

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 자연휴양림 조성계획 승인(전북도) ‘22. 9월
- 상하수도, 부지조성 등 토목공사 착공 ‘22. 11월
- 자연휴양림 지정 변경 고시(36→49ha/산림청) ‘22. 11월

【2023. 1 ~ 12월】

- 전기, 통신, 소방공사 착공 ‘23. 3월
- 조성계획 변경 승인(전북도) ‘23. 11월
- 건축공사 계약(숲속의 집 9동, 산림휴양관) ‘23. 12월

【2024. 1 ~ 12월】

- 건축공사 착공 ‘24. 2월
- 1차 공사 완료(숲속의집 9동, 산림휴양관/토목,건축,전기,통신,소방) ‘24. 12월
- 야영장 등 실시설계 용역 시행 ‘24. 12월~‘25. 9월


【2025. 1 ~ 12월】

- 조성계획 변경 승인 신청(다목적구장→오토캠핑장/전북도) ‘25. 8월
- 시범운영 추진 ‘25. 10~11월
※ 시설물 재정비 및 개장 전 보완사항 사전 조치, 이용객 만족도 조사 실시
- 조성계획 변경 승인(전북도) ‘25. 12월

◆ 금후계획

- 숲속의집(2동), 오토캠핑장 등 공사 ‘25. 12월 ~ ‘26. 7월
- 설문조사 결과 미비사항 보완조치 ‘25. 12월 ~ ‘26. 2월
- 휴양림 운영(조성완료 시설물 대상) ‘26. 3월
- 휴양림 조성 완료 ‘26. 7월

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	도시과	
					직 위	전화번호
도시교통환경 (6-6)	2026년	국비,도비, 시비	100%	이행후 계속추진	과 장	5036
					팀 장	5801
					담당자	5802

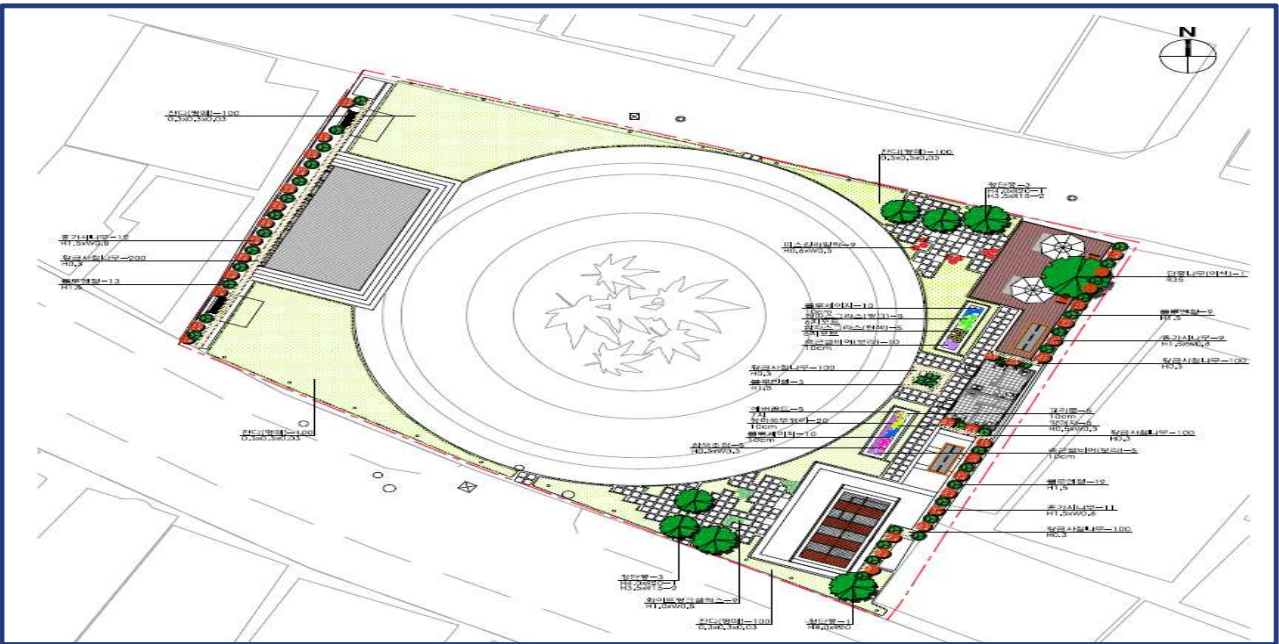

◆ 목 표

- 낙후되고 쇠퇴한 구도심 상권의 활성화를 위해 시민과 관광객들이 방문하여 쉬면서 즐길 수 있도록 조성하여 구도심 상가 방문을 제고로 구도심권 경제 활성화에 기여

◆ 개 요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 정읍시 수성동 558-2(구·정읍우체국)
- 총사업비 : 2,100백만원(철거 : 1,000백만원, 광장조성 : 1,100백만원)
- 사업규모 : 구·정읍우체국 철거 및 광장조성 1식
- 사업내용
 - 건물 4동 철거(총 연면적 2650㎡)
 - 광장(1965.6㎡), 조경 및 편의시설 1식

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	2,100	0	0	0	1,000	200	900	0
국비	700						700	
특금	1,000				1,000			
시비	400					200	200	

◆ 추진실적

- 구)정읍우체국 청사 및 부지 매입(회계과) '23. 6월
- 매입대금 7,557백만원(토지 7,022백만원, 건물 535백만원)
- 공유재산 인계(회계과→도시과) '25. 1월
- 지역주민 설문 조사 및 사업 설명회(새암로, 중앙로 상인회) '25. 4월
- 시의회 간담회 및 총괄계획가 자문 '25. 5월
- 지역수요맞춤지원(소규모) 공모 신청(국토부) '25. 5월
- 구)정읍우체국 철거 완료 '25. 2 ~ 6월
- 기본 및 실시설계용역 시행 '25. 7 ~ 12월
- 지역수요맞춤지원(소규모) 공모 최종 선정(국토부) '25. 8월
- 지역개발사업구역 지정용역 시행 '25. 9 ~ 12월
- 기본계획 수립 위한 주민의견 수렴 '25. 10 ~ 11월
- 새암달빛광장 조성사업 전기공사 시행 '25. 12월
- 화장실 실시설계용역 시행 '26. 5월

◆ 금후계획

- 사업구역 지정 및 실시계획 인가 '26. 6월
- 새암달빛광장 조성사업 시행 '26. 6 ~ 12월

60-1


정읍역 활성화 및 서남권교통 거점화

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	도시과	
					직 위	전화번호
도시·교통 환경 (6-7-1)	2024년	시비	100%	완료	과 장	5036
					팀 장	5801
					담당자	5802

◆ 목 표

- 정읍역 광장의 환경정비와 불편 최소화로 쾌적한 환경 제공
- 공연장 및 플리마켓 등 활용으로 서남권 교통 거점화 도모

◆ 개 요

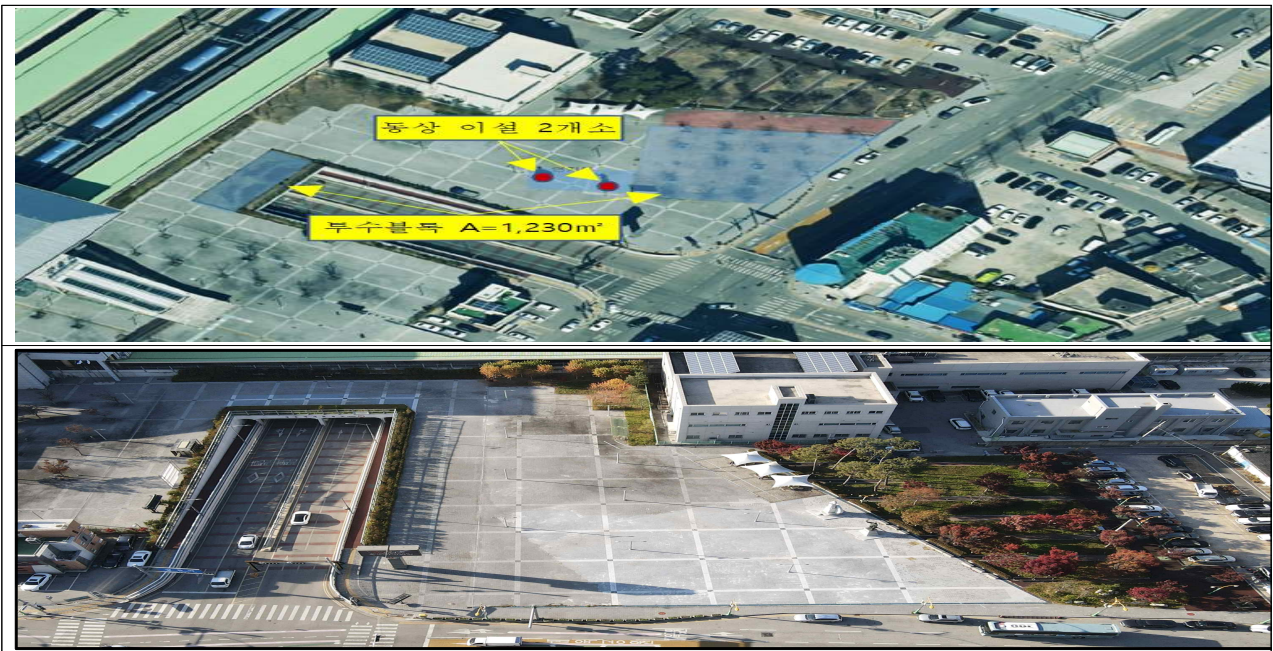

- 위 치 : 정읍역 광장 지하차도 일원(연지동 343-1, 343-383번지)
- 기 간 : 2023. 1월 ~ 2024년 12월(2년)
- 총사업비 : 220백만원(시비)
 - 2023년 : 70백만원 / 2024년 : 150백만원
- 주요내용 : 정읍역 광장 정비 1식
 - 투수블록 A=1,230㎡, 동상이설 등

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	220	0	0	70	150	0	0	0
시비	220			70	150			

◆ 추진실적

- 2023년 중기지방재정계획 승인 '22. 11월
- 코레일, 국가철도공단, 정읍시 합의 '22. 12월
- ‘정읍역광장 활성화 토론회’ 개최 '22. 12월
- 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 '23. 04월
 - 정읍천~정읍역 관광 핫플레이스 사업 연계하여 효과적인 사업 추진
- 기본계획 및 실시설계 용역 착수 '23. 05월
- 관계기관(한국철도공사) 협의 '23. 11월
- 정읍역 광장 조성 추진계획 보고(사업계획 변경건) '23. 12월
 - 당초 : 지하차도 복개 L=20m → 변경 : 광장정비 1식
 - 사유 : 복개부분 도로높이 확보로 단차 2m 발생, 광장 일원화 불가 → 사업효과 미비
- 정읍역 광장 지하차도 복개 사업비 삭감(15억) '23. 12월
- 2024년 제1회추경 예산 확보(1억5천만원) '24. 5월
- 정읍역 광장 정비사업 착공 '24. 9월
- 정읍역 광장 정비사업 준공 '24. 11월

◆ 문제점 및 대책

- 해당없음

60-2

정읍역 활성화 및 서남권교통 거점화

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	교 통 과	
					직 위	전화번호
도시·교통·환경 (6-7-2)	2024년	시비	100%	완료	과 장	5039
					팀 장	5941
					담당자	5943

◆ 목 표

- 정읍역 주변 주차 불편을 최소화하여 정읍시민과 정읍역 관광객들에게 쾌적한 환경을 제공, 전북 서남권 교통 거점화 도모

◆ 위 치 도



◆ 개 요

- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2024. 8.
- 사업위치 : 연지동 370-5
- 총사업비 : 360백만원(시비)
 - 2025년 사업비 : 13백만원(시비)
- 사업규모 : 주차장조성 3,355㎡ / 주차면수 122대
- 사업내용 : 아스콘포장 3,355㎡, 옹벽설치 150m, 주차관제시스템 설치

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
시비	360	-	-	308	13	13	13	13

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 임시공영주차장 부지 협의 '22. 10 ~ 11월

【2023. 1 ~ 12월】

- 국가철도공단 관리부지 사용 허가 '23. 4월
- 실시설계용역 완료 '23. 6월
- 공사 착공 '23. 9월
- 공사 중지(동절기) '23. 11월
- 공사 재착공 '24. 2월
- 공사 중지(관계기관 협의) '24. 3월

【2024. 1 ~ 12월】

- 공사 재착공 '24. 7월
- 공사 준공 '24. 8월
- 유료화 홍보(현수막 게시, 이통장 회보, 홈페이지 등) · '25. 1. 10. ~ 2. 2.

◆ 금후계획

- 주차장 유료화 운영 연중

분야 (분류번호)	완료 목표연도	예산	진도율	추진상황	교통과	
					직 위	전화번호
도시·교통·환경 (6-8)	2024년	시비	100%	완료	과 장	5039
					팀 장	5921
					담당자	5922

◆ 목 표

- 택시 운수종사자의 근로여건 개선으로 피로감 해소 및 안전사고예방
- 택시 운수종사자 복지향상을 위한 시설 및 환경을 제공, 삶의 질과 운송 서비스 향상 기대

◆ 개 요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년
- 규모/시설 : 부지면적 260㎡(78평), 건축연면적 182,8㎡(55평)
- 위 치 : 정읍시 연지동 343-411번지
- 총사업비 : 743백만원(시비)
 - 2025년 사업비 : 7백만원(시비)
- 내 용 : 1층(사무실, 휴게실), 2층(체력단련실, 샤워실) 쉼터

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
시비	743	-	-	700	22	7	7	7

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 택시 운수종사자 쉼터 조성 계획 수립 '22. 8월
- 공유재산 심의 완료 '22. 10. 27.
- 타시군 벤치마킹(경기도 안산시 외 4개소) 추진 '22. 12월

【2023. 1 ~ 12월】

- 택시 쉼터조성에 관한 의견수렴(개인, 법인택시 대표) '23. 1. 6.
- 실시설계 용역 '23. 4 ~ 6월
- 공사계약 및 착공 '23. 8월
- 공사 준공(감독관, 감리, 시행사, 계약팀장) 검사 '23. 12. 6.
- 시장님 쉼터 현장방문 '23. 12. 14.
- 물품구입 '23. 12. 29.
 - 안마기 3대, 운동기구 7종(레그프레스머신 등), 1,2층 블라인드 설치 등

【2024. 1 ~ 2026. 5월】

- 택시 운수종사자 쉼터 내·외부간판 제작·설치 '24. 1. 11.
- 전기충전소 설치(자원순환과 1대) '24. 3월
- 택시 운수종사자 쉼터 조례 제정 '24. 4월
- 택시 운수종사자 쉼터 운영비 확보 '24. 5월
- 택시 운수종사자 쉼터 운영 '24. 6. 1.
 - 개인택시단위조합 사용허가 (' 24. 6. 1. ~ 12. 31.)
- 운동기구 추가 구입(아령운동 세트, 헬스사이클) ... '24. 7월/12월
- 택시 운수종사자 쉼터 운영 '25. 1월 ~ 12월
 - 개인택시단위조합 사용허가 ('25. 1. 1. ~ 12. 31.)
 - 공공운영비 지원(전기요금, 상하수도요금), 택시 단체 요구사항 반영
- 택시 운수종사자 쉼터 운영 '26. 1월 ~
 - 개인택시단위조합 사용허가 ('26. 1. 1. ~ 12. 31.)

◆ 금후계획

- 택시 운수종사자 쉼터 운영 계속

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	교통과	
					직 위	전화번호
도사교통환경 (6-9)	2023년	도비, 시비, 자부담	100%	완료	과 장	5039
					팀 장	5911
					담당자	5914

◆ 목 표

- 우리 시 관문인 시외버스 공용터미널 환경개선을 통한 이용객 편의 제공 및 방문객에게 호감을 주는 정읍 이미지 제고

◆ 개 요

- 기 간 : 2023. 2 ~ 12월
- 대 상 : 정읍공용버스터미널
- 사 업 비 : 127백만원(도비 39, 시비 63, 자부담 25)
- 2026년 : 50백만원(도비 12, 시비 28, 자부담 10)

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	127	0	0	77	0	0	50	0
국비	0							
균특	0							
도비	39			27			12	
시비	63			35			28	
기타 (자부담)	25			15			10	

◆ 추진실적(2022. 7 ~ 2026. 5.)

【2022. 7 ~ 12월】

- '23년 여객자동차터미널 정비사업 도비 신청 '22. 8월
- '23년 여객자동차터미널 정비사업비 확정 '22. 11월

【2023. 1 ~ 12월】

- 터미널 환경개선을 위한 사전협의 '23. 2월
- 터미널 환경개선 보조금 교부 결정 '23. 3월
- 터미널 환경개선 사업 추진 '23. 3 ~ 4월
 - 터미널 화장실, 출입문, 난방시설 및 외벽 송판 보수, 캐노피 기둥 도색 등
- 터미널 환경개선 사업 완료 및 보조금 정산 '23. 4월
- 터미널 환경개선 보조금 교부 결정(2차) '23. 8월
- 터미널 환경개선 사업 추진 '23. 8월
 - 터미널 감시카메라(CCTV) 보수
- 터미널 환경개선 사업 완료 및 보조금 정산 '23. 9월

【2026. 1 ~ 5월】

- 여객자동차터미널 시설물 정비사업 교부 결정 '26. 4월
- 여객자동차터미널 시설물 정비사업 추진 '26. 5월
 - 옥상 방수 공사, 냉난방 공조 기기 보수 등
- 여객자동차터미널 시설물 정비사업 완료 '26. 5월

◆ 금후계획

- 여객자동차터미널 시설물 정비사업 교부 결정(태인터미널) '26. 6월
- 여객자동차터미널 시설물 정비사업 추진(태인터미널) '26. 6월
 - 전동보장구 비가림시설 설치 등
- 여객자동차터미널 시설물 정비사업 완료(태인터미널) '26. 7월

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	교통과	
					직 위	전화번호
도사교통환경 (6-10)	2026년	비예산	100%	완료 후 계속추진	과 장	5039
					팀 장	5911
					담당자	5914

◆ 목 표

- 시민 대중교통 수요에 맞는 시내버스 운행 개편을 통해 대중교통 이용 활성화 도모

◆ 개 요

- 운 행 사 : (주)대한고속(대표이사 이호진)
- 인력현황 : 91명(운전직 82명, 정비직 2명, 관리직 7명)
- 운행대수 : 53대(운행 51대, 예비 2대)
- 운행노선 : 228개 노선 / 4,883.5km ※ 벽지노선 : 68개 노선 / 304.1km

◆ 추진실적(2022. 7 ~ 2026. 5.)

【2022. 7 ~ 12월】

- 상교동 진산마을 배차시간 조정 주민 간담회(3회) '22. 11월
- 배차시간 및 노선 조정 완료

【2023. 1 ~ 12월】

- 내장산 실버아파트 시내버스 경유 협의(2회) '23. 7월
- 노선 조정 완료

【2024. 1 ~ 12월】

- 정일중 시내버스 노선 협의 간담회 '24. 6월
- 통학버스 운행에 따라 기존 하교 시간대 2개 노선 통합 운행
- 소성 205번 노선 조정에 대한 협의 '24. 7월
- 기존 노선을 이용하는 주민들의 반대로 노선 조정 불가

【2025. 1 ~ 12월】

- 북면 244번 노선 변경 요청에 따른 의견 조회 '25. 6월
 - 노선 변경은 필요하지만 이용객들의 혼선을 야기할 수 있으므로 변경 시 고려 필요

【2026. 1 ~ 5월】

- 정일중 시내버스 노선 조정 협의 간담회 '26. 3월
 - 환승제 도입에 따른 시내버스 노선 조정(오전, 오후 각각 1회 운행)
- 시내순환노선 실버아파트 운행 시간 조정 협의 '26. 4월
 - 노인일자리 사업 참여자 탑승 수요 반영을 통한 조정
- 덕천면 장문마을 버스 노선 조정 협의 '26. 5월
 - 오전, 오후 각각 1회 마을 안길 버스 경유

◆ 금후계획

- 배차시간 및 노선 현실화를 위한 주민 의견 수렴 및 간담회 개최 ... 수시

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	교통과	
					직 위	전화번호
도사교통환경 (6-11)	2025년	도비, 시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5039
					팀 장	5921
					담당자	5922

◆ 목 표

- 다양한 운송체계로 대중교통 취약 지역 주민 및 중고등학생들의 이동권 보장
- 운수종사자의 실질적인 수익증대와 질 높은 택시 교통서비스 제공

◆ 개 요

- 기 간 : 2024 ~
- 규 모 : 511대(개인 343, 법인 168)
- 총사업비 : 2,734백만원(도 360, 시 2,374)
 - 2026년 사업비 : 469백만원(도 95, 시 374)
- 주요내용 : 관제센터 운영비, 통신비, 카드수수료, 단말기 통신비 등 지원

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	2,734	-	400	450	477	469	469	469
도비	414	-	60	60	42	62	95	95
시비	2,320	-	340	390	435	407	374	374

◆ 추진실적

【2022. 1 ~ 12월】

- 2022년 콜센터 운영비, 통신비 등 지원 200백만원/22. 1월
 - 운영비(내장산콜 120, 연합콜 40), 통신비(내장산콜 30, 연합콜 10)
- 2022년 택시요금 카드수수료 및 통신비 지원월 5,500원 ... 200백만원/22. 7월, 12월

【2023. 1 ~ 12월】

- 2023년 콜센터 운영비, 통신비 등 지원 250백만원/'23. 1월
 - 운영비(내장산콜 135, 연합콜 75), 통신비(내장산콜 30, 연합콜 10)
- 2023년 택시요금 카드수수료 및 통신비 지원(월 5,500원) ... 200백만원/'23. 7월, 12월

【2024. 1 ~ 12월】

- 2024년 콜센터 운영비, 통신비 등 지원 250백만원/'24. 1월
 - 운영비(내장산콜 135, 연합콜 75), 통신비(내장산콜 30, 연합콜 10)
- 2024년 택시요금 카드수수료 및 통신비 지원(월 5,500원) · 227백만원/'24. 7월, 12월

【2025. 1 ~ 12월】

- 2025년 콜센터 운영비, 통신비 등 지원 250백만원/'25. 1월
 - 운영비(내장산콜 135, 연합콜 75), 통신비(내장산콜 30, 연합콜 10)
- 2025년 택시요금 카드수수료 및 통신비 지원(월 5,500원) ... 219백만원/'25. 7월, 12월

【2026. 1 ~ 5월】

- 2026년 콜센터 운영비, 통신비 등 지원 251백만원/'26. 1월
 - 운영비(내장산콜 135, 연합콜 85), 통신비(내장산콜 23, 연합콜 8)

◆ 금후계획

- 2026년 택시요금 카드수수료 및 통신비 지원(월 5,500원) ... 219백만원/'26. 7월, 12월

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	교통과	
					직 위	전화번호
도사교통환경 (6-12-1)	2026년	국비, 도비, 시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5039
					팀 장	5941
					담당자	5942 5943

◆ 목 표

- 보호구역 내 노후된 각종 교통시설물의 신속한 정비로 교통사고 사전 예방 및 안전하고 편리한 교통환경 조성
- 노인보호구역과 마을주민 교통사고 위험지역 교통안전시설물 설치로 보행자의 안전 확보와 교통약자의 소중한 생명보호
- 등록 자동차 증가에 따른 도심지역 부족한 주차공간을 확보, 시민 주차불편 해소 및 지역경제 활성화 도모

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년
- 대 상 : 정읍시 관내 보호구역 및 공영주차장 일원
- 총사업비 : 35,180백만원(국 1,300, 도 6,211, 시 27,669)
- 2025년 : 5,533백만원(도 1,208 시 4,325)

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	35,180	0	3,395	5,814	9,646	5,533	5,396	5,396
국비	1,300	-	900	200	200	-	-	-
도비	6,211	-	156	1,372	1,765	1,208	855	855
시비	27,669	-	2,339	4,242	7,681	4,325	4,541	4,541

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 새암로 도심 공영주차장 조성사업 준공 '22. 7월
- 공영주차장 조성 A=837㎡, 주차면수 24면 / 176백만원
- 각시다리 도심 공영주차장 조성사업 준공 '22. 10월
- 공영주차장 조성 A=1,239㎡, 주차면수 29면 / 127백만원
- 어린이보호구역 적색신호등 설치 사업 '22. 12월
- 교암초 외 16개소 / 61백만원 / 적색신호등 교체 16개소, 신호등 철거 3개소
- 2022년 마을주민 보호구간 조성사업 '22. 12월
- 이평면 창전마을, 태인면 공사마을 / 350백만원 / 표지판 설치(시·중점 표지판 등) 35개, 차선도색 A=488㎡ 등

【2023. 1 ~ 12월】

- 서부로 노상주차장 조성사업 '23. 8월
- 도로노면표시재정비 L=300m, 주차면수 25면 / 27백만원
- 동초등학교 사거리 정비사업 '23. 10월
- 정읍동초교 / 91백만원 / 차선도색 A=801㎡, 미끄럼방지포장 A=1,033㎡ 등
- 2023년 마을주민 보호구간 조성사업 '23. 10월
- 원상평마을 / 180백만원 / 투광등 설치 3EA, 미끄럼방지포장 A=1,053㎡ 등
- 장명동 동초교앞 공영주차장 조성사업 준공 '23. 11월
- 임시공영주차장 조성 A=668㎡, 주차면수 20면 / 67백만원
- 서영여고 후문 공영주차장 조성사업 준공 '23. 12월
- 임시공영주차장 조성 A=805㎡, 주차면수 23면 / 70백만원

【2024. 1 ~ 12월】

- 상동 영무예다음 임시공영주차장 조성사업 준공 '24. 4 ~ 6월
- 임시공영주차장 조성 A=1,602㎡, 주차면수 51면 / 44백만원
- 부영2차 후문앞 임시공영주차장 조성사업 준공 '24. 4 ~ 6월
- 임시공영주차장 조성 A=652㎡, 주차면수 20면 / 16백만원
- 미소거리 공영주차장 조성사업 준공 '24. 7월
- 공영주차장 조성 A=2,420㎡, 주차면수 75면 / 334백만원
- 개구리주차장 개선사업 준공 '24. 7 ~ 9월

- 험프경계석 교체 L=244m(연지동 26-1번지 일원) / 45백만원
- 하나로마트 옆 공영주차장 조성사업 준공 '24. 7 ~ 9월
 - 공영주차장 조성 A=1,375㎡, 주차면수 41면 / 243백만원
- 중앙3길 공영주차장 조성사업 준공 '24. 7 ~ 10월
 - 공영주차장 조성 A=55㎡, 주차면수 9면 / 54백만원
- 부영1차 앞 공영주차장 조성사업 준공 '24. 9 ~ 10월
 - 공영주차장 조성 A=305㎡, 주차면수 12면 / 28백만원
- 2024년 상·하반기 어린이보호구역 개선사업 '24. 5월/12월
 - 덕천초 외 26개소 / 853백만원 / 방호울타리 L=1,186m, 미끄럼방지포장 A=2,862㎡, 노면표시 A=4,808㎡ 등
- 어린이보호구역 스마트횡단보도 설치사업 '24. 10월
 - 정읍동초교 / 100백만원 / 정지선자킴이 시스템 1식, 보행신호음성안내보조장치 10대

【2025. 1 ~ 12월】

- 주차장 수급 및 안전관리 실태조사 수립용역 시행 '25. 1 ~ 7월
- 신태인읍 공영주차장 조성사업 준공 '25. 4월
 - 공영주차장 조성 3,107.7㎡, 86면 / 249백만원
- 어린이보호구역 과속경보시스템 설치 사업 '25. 5월
 - 수성초 외 4개소 / 100백만원 / 과속경보시스템 설치 10대
- 어린이보호구역 개선사업(정읍북초교) '25. 5월
 - 정읍북초교 / 80백만원 / 인도정비 L=136m, 방호울타리 L=342.0m
- 2025년 상반기 어린이보호구역 개선사업 '25. 6월
 - 한솔초 외 6개소 / 45백만원 / 차선도색 A=544㎡, 표지판 이설 등
- 샘고을시장1 공영주차장 조성사업 준공 '25. 6월
 - 공영주차장 조성 417㎡, 13면 / 268백만원
- 국제사진관 뒤 공영주차장 조성사업 준공 '25. 6월
 - 공영주차장 조성 695㎡, 18면 / 204백만원
- 초산동 옆 임시공영주차장 조성사업 준공 '25. 7월
 - 임시공영주차장 조성 432㎡, 12면 / 18백만원
- 2025년 노인보호구역 개선사업 '25. 8월
 - 정읍시노인복지관 외 5개소 / 10백만원 / 기·종점 노면표시

- 새싹유치원 어린이보호구역 해제 정비 공사 '25. 9월
 - 구새싹유치원 어린이보호구역 / 61백만원 / 차선도색 A=664m², 표지판 설치 9개 등
- 어린이보호구역 무인교통단속장비 설치 '25. 10월
 - 과교어린이집 / 50백만원 / 과속단속카메라 설치 2대
- 2025년 하반기 어린이보호구역 개선사업 '25. 10월
 - 동신초 외 8개소 / 54백만원 / LED 표지판 설치 6개, 방호울타리 설치 L=60m 등
- 어린이보호구역 개선사업(보조) '25. 10월
 - 정읍남초 외 17개소 / 150백만원 / 인도장비 및 방호울타리 교체, 가·종점 노면표시 등
- 보호구역(어린이·노인) 실태조사 사업 '25. 11월
 - 어린이보호구역 39개소, 노인보호구역 6개소 / 105백만원 / 보호구역 내 교통환경, 시설물 등 실태조사

◆ 금후계획

- 소명교회 인근 공영주차장 조성사업 '26. 7월
 - 공영주차장 조성 A=1,409m², 38면 / 1,026백만원
- 샘고을시장2 공영주차장 조성사업 '26. 5 ~ 7월
 - 공영주차장 조성 A=418m², 11면 / 848백만원
- 시기동 공영주차장 조성사업 '26. 3 ~ 7월
 - 공영주차장 조성 A=1,390m², 41면 / 1,450백만원
- 터미널 사거리 주차타워 조성사업 '25. 9월 ~ '27. 12월
 - 주차타워 건축 2,483m², 126면 / 5,420백만원(도2,710, 시2,710)
- 현대1차아파트앞 공영주차장 조성사업 '26. 2 ~ 11월
 - 공영주차장 조성 A=1,697m², 48면 / 1,818백만원
- 현대3차아파트뒤 공영주차장 조성사업 '26. 2 ~ 11월
 - 공영주차장 조성 A=1,184m², 33면 / 1,303백만원
- 칠보초등학교옆 공영주차장 조성사업 '26. 2 ~ 11월
 - 공영주차장 조성 A=437, 14면 / 58백만원

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	건설과	
					직 위	전화번호
도시·교통· 환경 (6-12-2)	2026년	시비	100%	이행후 계속추진	과 장	5037
					팀 장	5851
					담당자	5853

◆ 목 표

- 안전한 보행환경 및 인도 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 보행환경 유지
- 도로에 설치된 과속방지턱에 대하여 도로법 규격에 맞게 재정비

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 위 치 : 정읍시 시가지 내
- 총사업비 : 11,094백만원(시 11,094)
- 2026년 사업비 : 865백만원(시 865)
- 내 용 : 인도정비 및 과속방지턱 설치(정비)
 - 정읍시 관내 과속방지턱 1,012개소

총 계	양호	정비대상			비고
		계	파손 및 경사로 미흡	재도색	
1,012	829	183	62	121	

- 과속방지턱 매년 40개소 신설 및 100개소 정비 추진 계획
- 정읍시 인도 현황 124.56km(시내권 82.07km, 시외권 42.49km)
 - 인도 정비 매년 5개소(약 2km) 정비(매년 1,500백만원 목표)

◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
시비	11,094 (8,015)	3,079	1,550	3,570	580	510	865	940

◆ 추진실적

【2022 ~ 2026년도 추진】

- 과속방지턱 실태조사 완료 ’ 22. 9월
- 과속방지턱 정비 및 신설 : 총 379개소, 1050백만원 ’ 22 ~ ’ 25년
- 인도 정비 : 총 36개소 / 5,570백만원 ’ 22 ~ ’ 25년
 - 북면소재지(북면우체국~정읍한우) 인도정비공사 등 36개소 추진 완료
- ’ 26년 인도정비공사 과속방지턱 신설 및 정비 ’ 26. 1 ~ 6월
 - 인도정비 : 8개소, 550백만원
 - 과속방지턱 : 24개소 신설, 정비 16개소, 재설치 10개소, 100백만원

◆ 금후계획

- 하반기 인도 정비 공사 및 과속 방지턱 정비 추진 ’ 26. 7 ~ 12월
 - 인도정비 : 4개소, 1,050백만원
 - 과속방지턱 : 30개소 신설, 정비 16개소, 재설치 5개소, 100백만원
- ※ 1회추경 확보 금액 : 인도정비 3개소 950백만원(특교세, 특조금,도비)

66-1

노후 상수도 관로개선

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	상하수도사업소	
					직 위	전화번호
도사교통환경 (6-13-1)	2024년	국비, 도비, 시비	100%	완료	소 장	5050
					팀 장	6471
					담당자	6472

◆ 목 표

- 지방상수도 관로 노후로 인하여 유수율 제고 한계가 발생하고, 수질문제가 점진적으로 증가하고 있어 노후관 교체를 통한 유수율 제고 및 수질문제 해결

◆ 개 요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
- 대 상 : 정읍시 일원(마곡·장명(배) 주배수관로 및 4개 소블록)
- 사 업 비 : 24,600백만원(국비 12,300, 도비 2,460, 시비 9,840)
- 사업내용 : 노후 상수도관 L=21.3km 교체·정비, 밸브실 신설 등

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	24,600 (14,760)	9,840	4,920	4,920	4,920	-	-	-
국비	12,300 (7,380)	4,920	2,460	2,460	2,460	-	-	-
도비	2,460 (1,476)	984	492	492	492	-	-	-
시비	9,840 (5,904)	3,936	1,968	1,968	1,968	-	-	-

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 노후관로 교체공사(1단계) 준공 '22. 6월
- 상수도관 교체 L=8.7km(장명 주배수관로 및 장명3블록)
- 노후관로 교체공사(2단계) 실시설계 완료 '22. 9월

【2023. 1 ~ 12월】

- 노후관로 교체공사(2단계) 착공 '23. 2월
- 상수도관 교체 L=7.2km(마곡·장명 주배수관로)

【2024. 1 ~ 12월】

- 노후관로 교체공사(2단계) 준공 '24. 12월
- 상수도관 교체 5.4km(마곡배수지~동초사거리) / 공정률 : 100%

분야 (분류번호)	완료 목표연도	예산	진도율	추진상황	상하수도사업소	
					직 위	전화번호
도시교통환경 (6-13-2)	2026년	국비, 도비, 시비	100%	완료 후 계속추진	소 장	5050
					팀 장	6491
					담당자	6495

◆ 목 표

- 노후 하수관로 정밀조사 결과 도출된 문제점을 개선함으로써 노후 및 손상된 하수관로를 전반적으로 개·보수 조치

◆ 개 요

- 기 간 : 2021년 ~ 2026년(6년)
- 위 치 : 정읍시 일원(수성동, 장명동, 내장상동, 시기동, 초산동, 연지동)
- 사 업 비 : 7,933백만원(국비 3,957, 도비 397, 시비 3,579)
 - 2025년 : 3,754백만원(국비 2,572, 도비 258.3, 시비 923.7)
- 사업내용
 - 굴착보수 : D200 ~ D1200 L=747m
 - 비굴착보수 : 원형관 - 전체보수 L=127.5m, 부분보수 389개소
수로암거 - 전체보수 L=1,605.3m, 부분보수 10.8㎡

◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	7,933 (6,933)	1,000	-	884	2,295	3,754	-	-
국비	3,957 (3,457)	500	-	142	743	2,572	-	-
도비	397 (347)	50	-	14	74.7	258.3	-	-
시비	3,579 (3,129)	450	-	728	1,477.3	923.7	-	-

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 재원협약(재협약) '22. 08월
- 설계용역 완료 '22. 11월
- 행정절차(도원가심사) 이행 및 국비확보 '22. 12월

【2023. 1 ~ 12월】

- 공사 착공 '23. 1월
- 실시설계(도면) 보완 '23. 6월
- 건설사업관리용역(1차분) 착수 '23. 9월
- 공사(1차분) 준공 '23. 12월

【2024. 1 ~ 12월】

- 공사(2차분) 착공 '24. 3월
- 건설사업관리용역(1차분) 완료 및 2차분 착수 '24. 6월
- 공사(2차분) 준공 '24. 12월

【2025. 1 ~ 12월】

- 공사(3차분) 착공 '25. 3월
- 건설사업관리용역(2차분) 완료 및 3차분 착수 '25. 5월

【2026. 1 ~ 5월】

- 공사(3차분) 기성부분 준공(3회_96.2%) '26. 5월

◆ 금후계획

- 공사(3차분) 완료 '26. 6월
- 건설사업관리용역(3차분) 완료 '26. 8월
- 최종사업 준공 '26. 9월

※ '23~24년도 불용액에 대한 추경예산(잔여분 공사비) 편성 후
설계변경 등 행정절차 마무리
